

ООО "ТеплоЭнергоЛюкс"

(наименование организации-разработчика ППР)

УТВЕРЖДАЮ

(главный инженер)

ООО "ТеплоЭнергоЛюкс"

(наименование строительного-монтажного управления)

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ППР 69-2/20**

На выполнение работ предусмотренные проектом 1-3 я очереди

(наименование работ)

«Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения зданий бригадных домов НГДУ "Речицанефть" 1-3 я очереди»

1 ОЧЕРЕДЬ. Бригадный дом ГЗУ "БЕРЕЗИНКА".

2 ОЧЕРЕДЬ. Бригадный дом ГЗУ "Ю.ОСТАШКОВИЧИ"

3 ОЧЕРЕДЬ. Бригадный дом БКНС-2 "РЕЧИЦА"

(наименование объекта)

СОГЛАСОВАНО

(должность)

ООО "ТеплоЭнергоЛюкс"

(наименование организации-генподрядчика (заказчика))

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

(руководитель)

ООО "ТеплоЭнергоЛюкс"

(наименование организации-разработчика ППР)

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

(инженер по охране труда)

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.org.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.....	3
3.	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ	5
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ.....	6
5.	СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ.....	6
6.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ	6
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.....	6
7.1	Подготовительный период	6
7.1.1	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного периода. .	6
7.1.2	Организация подготовительного периода общие положения.....	7
7.1.3	Вырубка деревьев и кустарников	7
7.1.4	Устройство временного защитно-охранного ограждения	7
7.1.5	Обустройство бытовых помещений	8
7.2	Основной период	8
7.2.1	Привязка монтажного крана к бровке траншеи	8
7.2.2	Выбор монтажных кранов.	8
7.2.3	Выбор основных строительных машин и методов производства работ.....	8
7.2.3.1	Выбор основных строительных машин.	8
7.2.3.2	Выбор основных методов производства работ.....	9
7.2.4	Расчет опасной зоны работы крана	12
7.2.5	Земляные работы по устройству траншей.....	12
7.2.6	Демонтаж участков асфальтового покрытия.....	13
7.2.7	Обратная засыпка	13
7.2.8	Устройство монолитных фундаментов	13
7.2.9	Устройство наружных сетей электроснабжения.....	14
7.2.10	Сварочные работы.....	14
7.2.11	Производство демонтажных, монтажных и ремонтно-строительных работ в условии эксплуатации здания.	16
7.2.12	Монтаж внутренних инженерных систем.....	16
7.2.13	Пробивка отверстий в стенах	17
7.2.14	Демонтаж внутренних стальных трубопроводов.....	17
7.2.15	Демонтаж технологического и специального оборудования.....	17
7.2.16	Демонтаж резервуара	18
7.3	Требования к стропальщикам.....	18
7.4	Основные указания по складированию	19

						«Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения зданий бригадных домов НГДУ "Речицанефть" 1-3 я очереди»		
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Гл. Инженер					09.20	69-2/20-ППР		
						С	1	70
						ООО "ТеплоЭнергоЛюкс"		
						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка		

Подключение сущ. Инфракрасного излучателя в комнате сушки спецодежды
 Установка приборов коммерческого и технического учета.
 Демонтаж существующего кабеля сети электроснабжения по месту прокладки кабеля КЛ 0.4-кВ
 Полный перечень работ определен локальными сметами и календарными планами приложение 1-3 к пояснительной записке.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ

Расчетная продолжительность по очередям 1-3 определена согласно календарных графиков приложение 1.

5. СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ

Снабжение строительной площадки материалами, конструкциями, оборудованием выполняется организацией согласно разработанного плана поставок строительных материалов на объект. Поставки материалов на объект складированных в открытой зоне доставлять объемом на одну смену, мелкогабаритные строительные материалы и инструмент хранятся в закрытом складе.

Ведомости потребности в материалах приведены в приложении 2

6. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ

Таблица 6.1 Потребность в рабочих кадрах

№ п/п	Наименование должности и рабочей специальности и квалификации (разряд)	Количество человек
1	2	3
	РАБОЧИЕ	
1	Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 4 разряда	2
2	Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 3 разряда	2
3	Электрогазосварщик 4 разряда	1
4	Слесарь-сантехник 2 разряда	3
5	Слесарь-сантехник 3 разряда	3
6	Монтажник 2р	2
7	Монтажник 3р	1
8	Бетонщик 2р	1
9	Бетонщик 3р	1

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Строительство объекта осуществляется в два периода:

- подготовительный
- основной.

До начала производства основных строительного-монтажных работ необходимо выполнить следующие работы подготовительного периода:

1. Устройство временного сигнального ограждения участков производства работ.
2. Выполнить обустройство санитарно-бытовых помещений на период производства работ.
3. Обеспечить временное электроснабжение и водоснабжение.

В основной период строительства осуществляются работы согласно проекта №69-2/19 (1-3 очереди).

7.1 Подготовительный период

7.1.1 Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного периода.

Погрузочно-разгрузочные работы выполнять краном КС3575

Доставка материалов осуществляется с помощью бортового автомобиля МАЗ 5336А3-320

									Лист
									6
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата				

7.1.2 Организация подготовительного периода общие положения

1. До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
 - оформить разрешение (ордер) на производство работ;
 - выполнить сигнальное ограждение участков производства работ;
 - установить паспорт объекта и схему движения транспорта по территории;
 - наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помещениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и т.д.;
 - организовать освещение рабочих мест и опасных участков;
 - оборудовать места для хранения грузозахватных приспособлений и тары согласно данным заказчика;
 - обеспечить стройплощадку временным водоснабжением и электроснабжением согласно раздела ПОС;
 - обозначить на местности хорошо видимыми знаками границы зон работы кранов и опасных зон;
 - установить стенд, оборудованный противопожарным инвентарем, согласно норм, утвержденных местными органами.
2. Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.
3. Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
 - обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;
 - не допускает несанкционированной вырубki древесно-кустарниковой растительности;
 - не допускает выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
 - выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
 - выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.
4. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством.
5. Исполнитель работ обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с привлечением, при необходимости, представителя проектировщика и органа государственного контроля (надзора).
6. В темное время суток освещение рабочих мест должно быть не менее 30 Люкс, освещенность строительной площадки – не менее 10 Лк в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
7. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, выгородить оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев предохранять от повреждений путем обшивки пиломатериалами высотой не менее 2 метра.
8. Запрещается складировать материалы между деревьями и ближе 1 метра от проекции кроны деревьев в плане.

7.1.3 Вырубка деревьев и кустарников

Запрещается вырубка и пересадка древесной и кустарниковой растительности, не предусмотренная проектом. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть выгорожены оградой, а стволы отдельно стоящих деревьев, в целях предохранения от повреждений обшить пиломатериалами на высоту не менее 2,0 м.

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.

7.1.4 Устройство временного защитно-охранного ограждения

При производстве работ соблюдать требования:

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства

Правил по охране труда при выполнении строительных работ.

Конструкция временного ограждения принять согласно требований ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) в качестве ограждения принят сигнальное ограждение.

									Лист
									7
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата			69-2/20-ППР	

7.1.5 Обустройство бытовых помещений

В качестве помещений для бытовых нужд выделены помещения в здании, где производятся работы по согласованию заказчика, в случае отсутствия согласования разместить санитарно-бытовые помещения (для переодевания, приема пищи, обогрева и т.д.) за пределами строительной площадки.

7.2 Основной период

Все работы производить в строгом соблюдении:

Правил по охране труда при выполнении строительных работ

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства

Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Бела-русь от 20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие – 28 февраля 2020 г.

7.2.1 Привязка монтажного крана к бровке траншеи

Привязка крана к бровке котлована выполнена в соответствии с требованиями:

Правил по охране труда при выполнении строительных работ.

Привязку выполнить согласно Правил по охране труда при глубине выемки 1 м- не менее 1,5м от основания откоса до ближайшей опоры машины, при 2 м не менее 3м

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор строительной машины

Глубина выемки, м	Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры строительной машины, м, для грунтов			
	песчаных	супесчаных	суглинистых	глинистых
1,0	1,5	1,25	1,00	1,00
2,0	3,0	2,40	2,00	1,50
3,0	4,0	3,60	3,25	1,75
4,0	5,0	4,40	4,00	3,00
5,0	6,0	5,30	4,75	3,50

7.2.2 Выбор монтажных кранов.

Максимальная масса груза при демонтаже резервуара составляет 2 тонны

Требуемый вылет крана составляет. 7,5м

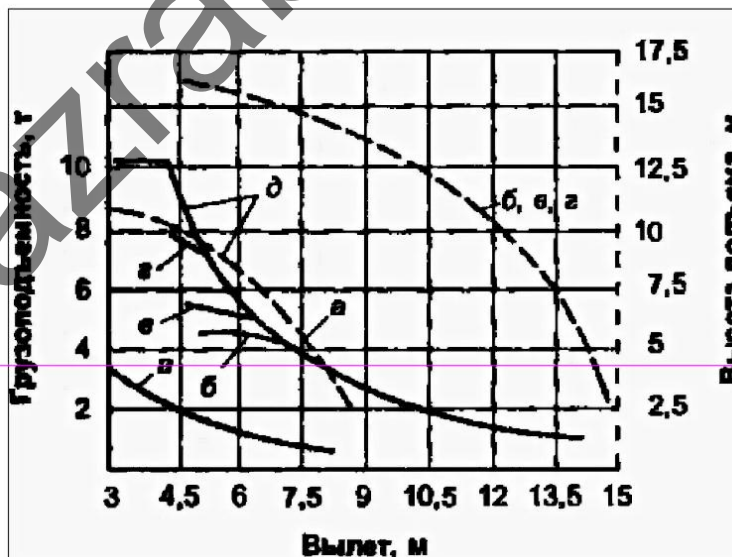


Рис. 7.2.2 Грузовые характеристики крана КС3575А

7.2.3 Выбор основных строительных машин и методов производства работ.

7.2.3.1 Выбор основных строительных машин.

Перемещение грунта производить экскаватор-бульдозер ЭО2621

Разработку грунта производить экскаватор-бульдозер ЭО2621

Уплотнение грунта осуществляется пневматическими трамбовками.

Перевозка грунта осуществляется самосвалами : МАЗ 5516

Демонтажные, монтажные и погрузочно-разгрузочные работы производить краном КС3575

									Лист
									8
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	69-2/20-ППР			

**7.2.3.2 Выбор основных методов производства работ.
1 ОЧЕРЕДЬ. БРИГАДНЫЙ ДОМ ГЗУ "БЕРЕЗИНКА".**

Демонтаж заглубленной емкости хранения печного-бытового топлива, согласно СГП позиция - 4, масса до 2 тонн, отметки резервуара определить на месте.

До начала производства работ принять акт передачи оборудования на демонтаж от заказчика с указанными техническими характеристиками демонтируемого.

Все работы производить только под непосредственным контролем ответственного за производства работ мастера (прораба)

Резервуар должен быть подготовлен для выполнения демонтажных работ заказчиком (пропарен, очищен, отсоединен от действующих технологических трубопроводов)

Работы по демонтажу производить автомобильным краном КС3575А. Расчетная масса резервуара 2 тонны, в случае обнаружения превышения расчетной массы мастеру или прорабу следует пересчитать допустимый вылет работы крана, который обеспечивает безопасную работу крана на данном вылете с данной массой резервуара.

До начала подъема резервуара произвести пробный подъем на высоту не более 10 см с выдержкой не менее 30 секунд.

Съема страховки резервуара приведена в графической части лист СГП

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту или сигнальщику, а при обслуживании одного крана несколькими стропальщиками сигнал должен подавать старший стропальщик.

Демонтаж фундаментов под резервуары производить экскаватором ЭО3322Б оборудованным гидромолотом.

Погрузка строительного мусора осуществляется экскаватором ЭО2621 обратная лопата с ковшом емкостью 0,25м3 в самосвал МАЗ 5516 и вывозится в места утилизации согласно проектной документации.

Демонтаж топливопровода с системой обогрева. Труба ТТ на СГП.

До начала производства работ принять акт передачи трубопроводов на демонтаж. (трубопроводы должны быть подготовлены к демонтажу)

Работы по отрывке топливопровода выполнять экскаватором ЭО2621 оборудованным ковшом обратная лопата 0,25м3

В процессе отрывки траншеи используется лобовая проходка.

Трубопровод демонтируется вручную с помощью ручного инструмента.

Строительные отходы грузятся в самосвал МАЗ 5516 и вывозятся в места утилизации.

Демонтаж жидкотопливного котла (масса до 120кг, демонтаж с помощью средств малой механизации, тележка, ленточные стропы подъем не менее чем 6 человек) и вспомогательного оборудования

Демонтаж следует производить под непосредственным контролем мастера (прораба)

Демонтаж производить поэлементно в разобранном виде.

Демонтаж производить с помощью средств малой механизации (тележка, гибкие стропы)

Перемещение грузов массой более 20 кг и на расстояние более 25 м в технологическом процессе должно производиться с помощью подъемно-транспортных устройств или средств механизации.

В случае невозможности применения средств механизации при подъеме и перемещении грузов вручную грузчиком (мужчины старше 18 лет) допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин).

Демонтаж радиаторной системы водяного отопления бригадного дома

Работы производить под контролем мастера (прораба)

Демонтаж производить с помощью ручного инструмента, газосварочных аппаратов. При выполнении работ на высоте более 1,2 м применять инвентарные подмости.

Монтаж отдельной электрической сети для подключения электрических обогревателей.

Работы выполняются вручную под непосредственным контролем мастера (прораба)

При выполнении работ на высоте более 1,2 м применять инвентарные подмости.

Установка стационарных электрических обогревателей (до 20 кг) с размещением их в местах, ранее установленных водяных радиаторов.

Работы выполняются вручную под непосредственным контролем мастера (прораба)

При выполнении работ на высоте более 1,2 м применять инвентарные подмости.

									Лист
									9
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата				

Демонтаж жидкотопливного котла (масса до 120кг, демонтаж с помощью средств малой механизации, тележка, ленточные стропы подъем не менее чем 6 человек) и вспомогательного оборудования

Демонтаж следует производить под непосредственным контролем мастера (прораба)

Демонтаж производить поэлементно в разобранном виде.

Демонтаж производить с помощью средств малой механизации (тележка, гибкие стропы)

Перемещение грузов массой более 20 кг и на расстояние более 25 м в технологическом процессе должно производиться с помощью подъемно-транспортных устройств или средств механизации.

В случае невозможности применения средств механизации при подъеме и перемещении грузов вручную грузчиком (мужчиной старше 18 лет) допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин).

Монтаж имеющейся в наличии гелиосистемы и подключение ее к существующей системе ГВС согласно ГП позиция 8

Монтаж гелиосистемы производится с помощью крана КС3575А гп. 10 тн.

Устройство фундаментов ФМ1 из монолитного бетона по бетонной подготовке (под металлическую раму)

Работы по устройству монолитных фундаментов производить в следующей последовательности:

Разработка ям с помощью экскаватора ЭО2621 0,25м3

Доработка грунта вручную с помощью лопат.

Устройство опалубки из деревянных щитов под фундаменты.

Устройство арматурных каркасов и сеток

Подвозка и прием бетонной смеси с автобетоносмесителя СБД-92-1

Укладка бетонной смеси слоями до 40 см с уплотнением с помощью глубинного вибратора.

Уход за бетоном.

Разборка опалубки с помощью ручного инструмента.

Обратная засыпка фундаментов с помощью экскаватора-бульдозера ЭО2621

Демонтаж существующего кабеля сети электроснабжения по месту прокладки кабеля КЛ 0.4-кВ

Разработка траншеи производится экскаватором ЭО2621.

Прокладка кабеля осуществляется вручную.

3 ОЧЕРЕДЬ. БРИГАДНЫЙ ДОМ БКНС-2 "РЕЧИЦА"

Демонтаж заглубленной емкости хранения печного-бытового топлива, согласно СГП позиция - 6, масса до 2 тонн, отметки резервуара определить на месте.

До начала производства работ принять акт передачи оборудования на демонтаж от заказчика с указанными техническими характеристиками демонтируемого.

Все работы производить только под непосредственным контролем ответственного за производства работ мастера (прораба)

Резервуар должен быть подготовлен для выполнения демонтажных работ заказчиком (пропарен, очищен, отсоединен от действующих технологических трубопроводов)

Работы по демонтажу производить автомобильным краном КС3575А. Расчетная масса резервуара 2 тонны, в случае обнаружения превышения расчетной массы мастеру или прорабу следует пересчитать допустимый вылет работы крана, который обеспечивает безопасную работу крана на данном вылете с данной массой резервуара.

До начала подъема резервуара произвести пробный подъем на высоту не более 10 см с выдержкой не менее 30 секунд.

Съема страховки резервуара приведена в графической части лист СГП

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту или сигнальщику, а при обслуживании одного крана несколькими стропальщиками сигнал должен подавать старший стропальщик.

Демонтаж фундаментов под резервуары производить экскаватором ЭО3322Б оборудованным гидромолотом.

Погрузка строительного мусора осуществляется экскаватором ЭО2621 обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25м3 в самосвал МАЗ 5516 и вывозится в места утилизации согласно проектной документации.

Демонтаж топливопровода с системой обогрева. Труба ТТ на СГП.

Демонтаж топливопровода с системой обогрева. Труба ТТ на СГП.

									Лист
									11
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата			69-2/20-ППР	

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

**ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В
ПРИБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ**

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП

ВЕБ-САЙТ

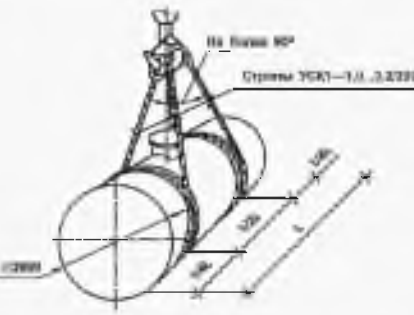
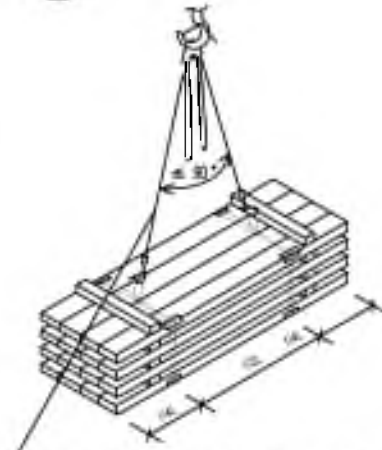
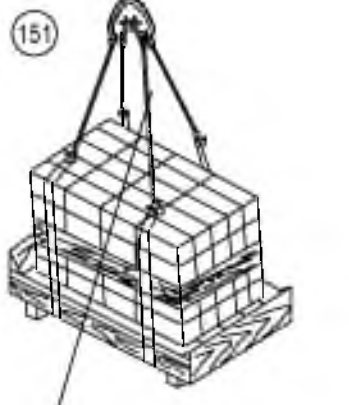
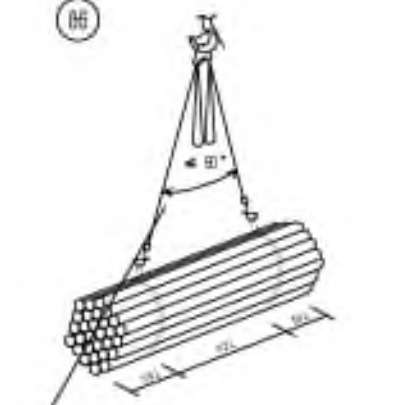

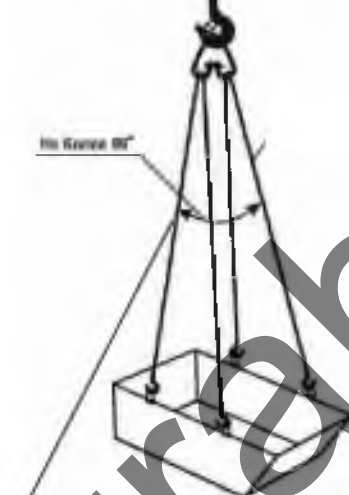
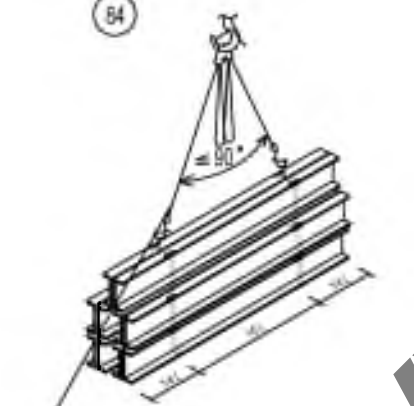
www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов

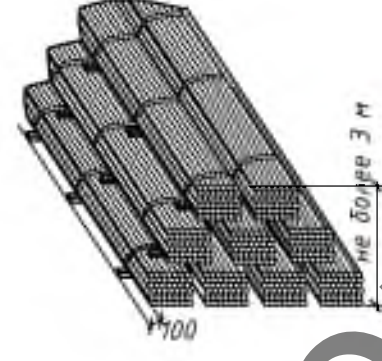


Республики Беларусь

Razrabotka PPR by

Схемы строповки

 <p>Резервуары</p>	<p>82</p>  <p>УСК-10,0/4000 ГОСТ25573-82+</p> <p>Щиты опалубки</p>	<p>151</p>  <p>УСК1-10,0/4000 ГОСТ25573-82+</p> <p>Поддон с плиткой</p>
<p>86</p>  <p>УСК-10,0/4000 ГОСТ25573-82+</p> <p>Трубы</p>	<p>24</p>  <p>Бадьа с бетоном</p>	<p>На высоте 80'</p>  <p>УСК1-10,0/4000 ГОСТ25573-82+</p> <p>Строповка контейнера под отходы</p>
<p>84</p>  <p>УСК-10,0/4000 ГОСТ25573-82+</p> <p>Строповка металлического притока</p>		

Схемы складирования

 <p>трубы</p>	<p>Рядная укладка</p>  <p>Деревянный брус</p>	<p>Прокладки 60 x 60</p>  <p>Прокатный металл</p>
--	--	--

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						69-2/20-ППР		
						"Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения зданий бригадных домов НГДУ "Речицанефть" 1-3 я очереди"		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Гл. инженер						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
						Стадия	Лист	Листов
						С	2	2
						схемы строповки и складирования		
						ООО "ТеплоЭнергоЛюкс"		
