

ООО «Строительное управление №202»  
(наименование организации – разработчика ППР)

**УТВЕРЖАЮ**

ООО «Строительное управление» №202»  
(наименование строительного- монтажного управления)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ  
92/23-ППР**

на **возведение жилого дома, устройство инженерных сетей,  
благоустройство**

\_\_\_\_\_  
(наименование работ)

**«Строительство четырехквартирного жилого дома в аг. Кемелишки  
Островецкого района»**

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта)

**РАЗРАБОТАЛ**

**СОГЛАСОВАНО**

ООО «Строительное управление №202»  
(наименование организации)

(должность)  
ООО «Строительное управление №202»  
(наименование организации)

Каменецкий А. В.  
(подпись, инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

\_\_\_\_\_  
(заказчик)

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**СПИСОК ОЗНАКОМЛЕННЫХ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.org.by

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ .....	5
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.....	6
3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....	7
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ.....	8
5.	СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ.....	8
6.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ .....	8
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.....	8
7.1	Подготовительный период .....	8
7.1.1	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного периода.....	8
7.1.2	Организация подготовительного периода общие положения .....	8
7.1.3	Вырубка деревьев и кустарников.....	10
7.1.4	Устройство временного защитно-охранного ограждения .....	10
7.1.5	Установка бытовых помещений.....	10
7.1.6	Устройство пункта очистки колес.....	11
7.2	Основной период (подземная часть).....	11
7.2.1	Привязка механизмов к бровке котлована.....	11
7.2.2	Выбор монтажного крана на устройство подземной части здания. ....	11
7.2.3	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на устройство фундаментов.....	12
7.2.4	Расчет опасной зоны работы крана при устройстве фундаментов.....	12
7.2.5	Земляные работы. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов .....	12
7.2.6	Устройство строительного водопонижения легкой иглофильтровой установкой ЛИУ .....	17
7.2.7	Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей .....	18
7.2.8	Требование к монтажу сборных железобетонных фундаментов.....	18
7.2.9	Технология монтажа фундаментных блоков .....	19
7.2.10	Обратная засыпка пазух фундаментов.....	21
7.3	Основной период (возведение надземной части здания).....	21
7.3.1	Выбор монтажного крана на возведение надземной части здания.....	22
7.3.2	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на возведение надземной части здания. ....	22
7.3.3	Расчет опасной зоны работы крана при возведении надземной части здания.....	22
7.3.4	Каменные работы .....	22
7.3.5	Монтаж плит перекрытия и покрытия .....	23
7.3.6	Сварочные работы.....	24
7.3.7	Устройство кровли (общие положения).....	25

						Строительство четырехквартирного жилого дома в аг. Кемелишки Островецкого района			
Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата				
Первый заместитель директора - гл. инженер						92/23-ППР	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Каменецкий					С	1	172
						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка	ООО «Строительное управление №202»		

7.3.8	Устройство стропильной системы .....	26
7.3.9	Монтаж профилированных листов кровли .....	29
7.3.10	Производство работ по заполнению оконных проемов.....	38
7.3.11	Монтаж внутренних инженерных систем.....	40
7.3.12	Штукатурные работы .....	45
7.3.13	Выполнение ЛШСУ .....	46
7.3.14	Малярные работы.....	47
7.3.15	Окраска фасада.....	48
7.4	Основной период (наружные сети) .....	49
7.4.1	Привязка механизмов к бровке котлована.....	49
7.4.2	Выбор монтажных кранов на работы при устройстве инженерных сетей.....	49
7.4.3	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов при устройстве инженерных сетей.....	49
7.4.4	Расчет опасной зоны работы крана при устройстве инженерных сетей.....	50
7.4.5	Земляные работы при устройстве выемок, котлованов и траншей.....	50
7.4.6	Земляные работы при устройстве сетей НВК.....	50
7.4.7	Земляные работы при устройстве сетей кабельных линий электроснабжения и связи.....	51
7.4.8	Монтаж ПИ-труб.....	51
7.4.9	Монтаж трубопроводов НВК.....	52
7.4.10	Монтаж полимерных труб.....	53
7.4.11	Монтаж кабельных линий.....	54
7.4.12	Электрическое освещение.....	57
7.4.13	Монтаж стальных трубопроводов НВК.....	58
7.4.14	Монтаж железобетонных колодцев сетей НВК.....	59
7.4.15	Испытание трубопроводов НВК.....	60
7.4.16	Обратная засыпка.....	61
7.4.17	Монтаж опор освещения.....	61
7.1.1	Монтаж резервуара для воды.....	62
7.5	Основной период (благоустройство).....	62
7.5.1	Выбор монтажного крана при проведении работ по благоустройству.....	62
7.5.2	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов при производстве работ по благоустройству.....	62
7.5.3	Расчет опасной зоны работы крана при возведении надземной части здания.....	63
7.5.4	Работы по срезке растительного слоя фронтальным погрузчиком.....	63
7.5.5	Работы по вертикальной планировке.....	63
7.5.6	Уплотнение основания площадки дорожным катком.....	64
7.5.7	Сооружение земляного полотна.....	64
7.5.8	Устройство слоев оснований.....	65
7.5.9	Озеленение территории.....	65
7.5.10	Установка бортового камня.....	66
7.5.11	Устройство покрытий из плит тротуарных.....	67
7.5.12	Устройство автомобильных дорог.....	71
7.6	Производство арматурных работ.....	73

										Лист
										2
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата					

7.7	Требования к производству опалубочных работ .....	74
7.8	Требования к производству бетонных работ .....	74
7.9	Требования к производству работ по распалубке монолитных конструкций.....	76
7.10	Производство работ при отрицательных температурах.....	76
7.10.1	Земляные работы в зимних условиях.....	76
7.10.2	Производство бетонных работ в зимних условиях.....	76
7.10.3	Монтажные работы при отрицательных температурах.....	77
7.10.4	Возведение каменных конструкций при отрицательных температурах .....	78
7.10.5	Кровельные работы при отрицательных температурах.....	78
7.10.6	Отделочные работы в зимних условиях.....	78
7.11	Требования к стропальщикам.....	78
7.12	Основные указания по складированию.....	79
7.13	Производство работ с лесов.....	80
7.13.1	Монтаж и демонтаж строительных лесов.....	81
7.14	Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей .....	83
7.14.1	Пересечение трубопроводов с подземными коммуникациями.....	83
7.14.2	Производство работ в охранных зонах кабельных линий электропередачи.....	84
7.14.3	Производство работ в охранных зонах сетей газоснабжения.....	85
7.15	Производство работ в охранной зоне воздушных электрических сетей .....	86
7.16	Электропрогрев бетона.....	88
7.17	Обеспечение электробезопасности при производстве работ.....	90
7.18	Производство работ с подъёмников типа АГП.....	92
8.	ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ .....	95
9.	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ .....	95
10.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ .....	96
11.	ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С РАСЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕМ УСЛОВИЙ ПРИВЯЗКИ ИХ К УЧАСТКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.....	98
12.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ .....	98
13.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЯЕМЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ....	98
14.	МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ХИЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ.....	99
15.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ОТ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕМОНТАЖА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	99
16.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	99
17.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	100
18.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.....	100
19.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО МЕСЯЦАМ.....	100
20.	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР .....	100
20.1	Общие положения.....	101
20.2	Мероприятия по технике безопасности при эксплуатации средств подмащивания .....	102
20.3	Требования безопасности при эксплуатации машин и транспортных средств.....	103
20.4	Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы .....	104
20.5	Техника безопасности при выполнении монтажных работ .....	105
20.6	Техника безопасности при выполнении земляных работ .....	106

										Лист
										3
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата					



## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект производства работ разработан на объект: «Строительство четырехквартирного жилого дома в аг. Кемелишки Островецкого района». На работы по возведению жилого дома, устройство инженерных сетей и благоустройство.

При разработке проекта производства работ были использованы следующие нормативные документы:

1. СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».
2. СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы».
3. СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
4. Р1.03.129-2014 Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения Утверждены ОАО «Оргстрой» 10.04.2014 и зарегистрированы РУП «Стройтехнорм» 12.02.2014 № 129.
5. СП 5.01.02-2023 Устройство оснований и фундаментов
6. СП 5.01.03-2023 Свайные фундаменты
7. Правила по охране труда при выполнении строительных работ. Утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33.
8. ТКП 45-5.01-276-2013 Основания и фундаменты зданий и сооружений рельсовые пути башенных кранов Нормы проектирования и правила устройства
9. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779. Введены в действие – 28 февраля 2020 г.
10. «Инструкция о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021г. № 82
11. СН 5.08.01-2019 Кровли
12. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и применения технологической документации на производство строительного-монтажных работ утв. Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 г.
13. Инструкция по охране труда для рабочего при монтаже и демонтаже металлических трубчатых лесов
14. Инструкция по охране труда при выполнении работ с лесов и подмостей
15. Инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих работы с люльки подъемника
16. Межотраслевых правил по охране труда при выполнении работ на высоте и верхолазных работ (действующая редакция)
17. ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок
18. ТКП 45-1.03-63-2007 (02250) Монтаж зданий. Правила механизации
19. Постановление Министерства труда Республики Беларусь 28.04.2001 № 52 Правила охраны труда при работе на высоте
20. Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66
21. Межотраслевая типовая инструкции по охране труда при работе на высоте утв. постановлением министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 27 декабря 2007 г. n 187
22. Правила по охране труда при работе на высоте утв. Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.
23. «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации строительных подъемников», утвержденные Постановлением МАиС РБ № 12/2 от 30.01.2006 г.;
24. Правила устройства электроустановок.
25. ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации»
26. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
27. ТКП 181-2022 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
28. ТКП 339-2022 Электроустановки на напряжение до 750 кВ линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
29. ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации»
30. Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями утв. первым заместителем Министра топлива и энергетики Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г.

									Лист
									5
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата			92/23-ППР	

31. ТКП 563-2014 (02260) "Требования безопасности при выполнении сварочных работ"
32. ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства
33. ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) Изоляционные покрытия. Правила устройства
34. СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
35. СП 4.04.06-2024 Монтаж электротехнических устройств
36. ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила устройства
37. ТКП 45-3.02-252-2011 (02250) Благоустройство территорий. Ограды. Правила проектирования и устройства
38. ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства
39. ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила устройства
40. ТКП 45-3.02-70-2009 (02250) Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия. Правила устройства
41. ТКП 45-4.01-272-2012 (02250) Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Правила монтажа


Исходными данными для разработки ППР послужили:

- проект организации строительства;
- ТНПА;
- утвержденная проектная документация;
- плановые сроки начала и окончания строительства;
- сведения о возможности привлечения средств механизации со стороны (в порядке аренды, услуг или субподряда);
- сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющихся в строительной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности использования;
- сведения о наличии в строительной организации технологической и организационной оснастки.

ППР разработан в соответствии с действующими нормами, правилами по производственной санитарии, техники безопасности, а также требованиями по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.

## 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Участок расположен в аг. Кемелишки Островецкого района

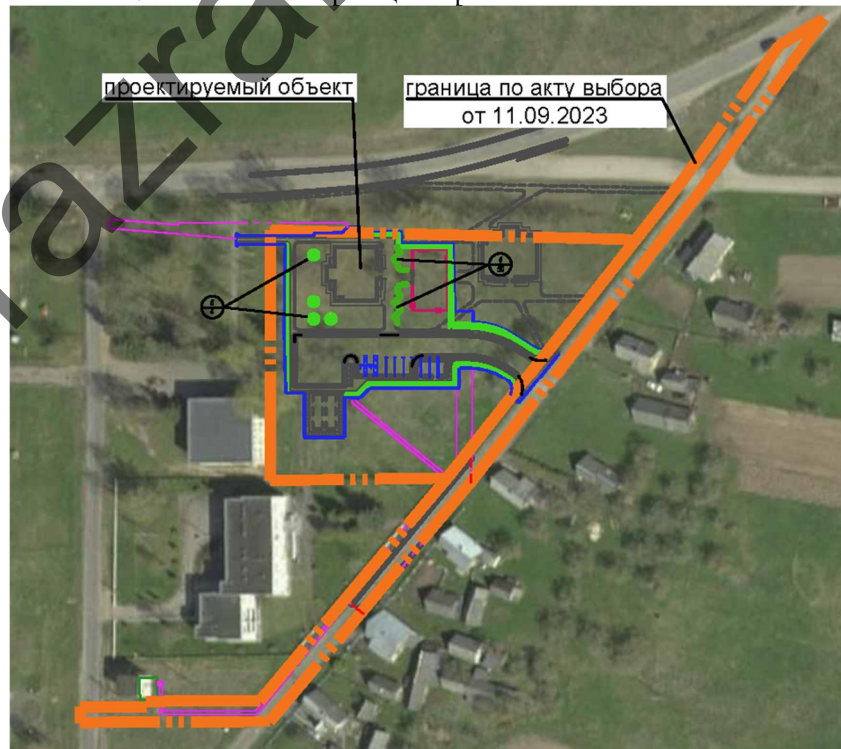

Ситуационный план

									Лист
									6
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата				

















Детально разработанную конструкцию ограждения и крепления стенок котлована или прорези, конструкцию перекрытия прорези, способы разработки и водоотлива котлована, обеспечивающие сохранность существующих конструкций и сооружений, безопасность движения транспорта и производства работ принимают согласно проектной документации.

При разработке котлованов в непосредственной близости от фундаментов существующих зданий и сооружений, а также подземных инженерных коммуникаций осуществляют соответствующие мероприятия, исключающие возможные их деформации и нарушения устойчивости откосов котлованов.

Мероприятия по обеспечению сохранности существующих зданий или сооружений и подземных инженерных коммуникаций осуществляют согласно проектной документации и согласовывают с эксплуатирующими их организациями.

Защиту котлована от поступления подземных вод осуществляют по 6.2 СП 5.01.02-2023. Мероприятия по отводу поверхностных вод выполняют не менее чем за 24 ч до начала производства земляных работ.

В зимних условиях котлованы, как правило, разрабатывают участками площадью не более 300 м<sup>2</sup>.

Грунт из котлована допускается складировать на бровке, обеспечивая устойчивость откосов котлована. Определение крутизны откосов временных выемок в однородных немерзлых грунтах приведено в приложении Л СП 5.01.02-2023.

Для крепления котлованов глубиной не более 4 м, как правило, применяют инвентарные приспособления (за исключением случаев крепления небольших котлованов, траншей и приямков сложной конфигурации, разрабатываемых вручную), которые устраивают таким образом, чтобы они не препятствовали производству последующих работ по устройству фундаментов. Последовательность разборки инвентарных приспособлений принимают с учетом обеспечения устойчивости стенок котлованов до окончания производства работ по устройству фундаментов.

Крепления котлованов глубиной более 4 м выполняют с учетом положений настоящих строительных правил.

При разработке котлована в водонасыщенных грунтах согласно проектной документации предусматривают мероприятия, исключающие наплыв грунта в котлован.

В случае если основания сложены из водонасыщенных мелких и пылеватых песков или глинистых грунтов текучепластичной и текучей консистенции, принимают меры по их защите от возможных нарушений при движении по ним землеройных и транспортных машин.

Значение недобора грунта в котловане, как правило, принимают согласно проектной документации и уточняют в процессе производства работ. Увеличение проектного значения недобора грунта согласовывают с проектной организацией.

Переборы грунта в котловане заполняют местным или песчаным грунтом с тщательным его уплотнением. Вид грунта заполнения и значение уплотнения согласовывают с проектной организацией.

Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, переборов грунта и других воздействий, выбирают по результатам опытного уплотнения грунта, на основе решения проектной организации.

Порядок опытного уплотнения грунтов естественного заложения и грунтовых подушек приведен в приложении М СП 5.01.02-2023.

Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов производят ступенями. Отношение высоты ступени к ее длине принимают согласно проектной документации, но не менее: 1:2 — в глинистых грунтах; 1:3 — в песчаных грунтах.

В случае отрывки котлована при переменной глубине заложения фундаментов грунт разрабатывают способами, обеспечивающими сохранение структуры грунта в ступенях основания.

Грунты естественного заложения в основании не соответствующие требуемой плотности, установленной в проектной документации, доуплотняют с помощью катков, тяжелых трамбовок и других грунтоуплотняющих механизмов.

Степень уплотнения грунта, выраженную плотностью сухого грунта или коэффициентом уплотнения, приводят в соответствие с установленными в проектной документации значениями, исходя из необходимости обеспечения требуемых прочностных и деформативных свойств грунта.

Способы устройства насыпей, грунтовых подушек, обратных засыпок, а также уплотнения грунта принимают согласно проектной документации и ППР в зависимости от назначения и требуемой степени уплотнения, вида и состояния грунтов, объема работ, имеющихся средств механизации, сроков производства работ и др.

Если в проектной документации отдельно установлены требования к водопроницаемости грунтов основания, то соответствующие мероприятия принимают согласно ППР.

Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, выравнивают с помощью подсыпки из песка (кроме пылеватого) толщиной слоя от 50 до 100 мм. Горизонтально спланированную поверхность песчаного основания выравнивают с использованием такого же песка.

Если основание сложено глинистыми грунтами консистенцией более 0,5 или водонасыщенными песками, основание доуплотняют легкими катками или трамбовками.

Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, выравнивают с помощью подсыпки из песка (кроме пылеватого) толщиной слоя от 50 до 100 мм. Горизонтально спланированную поверхность песчаного основания выравнивают с использованием такого же песка.

									Лист
									14
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата				



Если основание сложено глинистыми грунтами консистенцией более 0,5 или водонасыщенными песками, основание доуплотняют легкими катками или трамбовками.

Минимальную ширину траншей в соответствии с проектной документацией принимают:

— для ленточных фундаментов и других подземных конструкций — равной ширине конструкции с учетом устройства опалубки, толщины изоляции и креплений плюс 0,2 м в каждую сторону;

— под укладку трубопроводов, кроме магистральных, при крутизне откосов:

1:0,5 и более — по таблице 6.1 СП 5.01.02-2023;

менее 1:0,5 — не менее наружного диаметра прокладываемой трубы плюс 0,5 м при

укладке отдельными трубами и плюс 0,3 м — при укладке плетями;

— под укладку трубопроводов на участках кривых вставок — не менее двухкратной ширины траншеи на прямолинейных участках;

— для искусственных оснований под трубопроводы (кроме грунтовых подсыпок), коллекторы и подземные каналы — не менее ширины основания плюс 0,2 м в каждую сторону;

— при разработке одноковшовыми экскаваторами — не менее ширины режущей кромки ковша плюс 0,15 м — для песков и супесей, плюс 0,1 м — для глинистых грунтов;

— при разработке траншейными экскаваторами — не менее номинальной ширины отрывки.

Размеры приемков для заделки стыковых соединений трубопроводов в зависимости от их наружного диаметра принимают не менее значений, указанных в таблице 6.2 СП 5.01.02-2023.

В котлованах, траншеях и профильных выемках разработку элювиальных грунтов, изменяющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий, производят, оставляя защитный слой грунта, толщину которого и допустимую продолжительность контакта вскрытого грунта основания с атмосферой устанавливают согласно проектной документации. Защитный слой грунта удаляют непосредственно перед началом производства работ по возведению земляного сооружения.

Выемки в грунтах, кроме валунных и элювиальных, как правило, разрабатывают до проектной отметки с сохранением естественного сложения грунтов основания.

Допускается разработка выемок в два этапа: черновая (таблица 6.3, позиции 1-4 СП 5.01.02-2023) и окончательная, непосредственно перед возведением конструкции (таблица 6.3, позиция 5 СП 5.01.02-2023) — с учетом требований ТНПА в области контроля качества выполняемых работ (таблица 6.3 СП 5.01.02-2023).

Доработку недоборов грунта до проектной отметки производят с сохранением естественного сложения грунтов оснований.

Восполнение переборов грунта в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов производят местным грунтом с уплотнением до плотности, соответствующей грунту естественного сложения, или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа).

Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом высоты капиллярного поднятия воды по 6.1.32 СП 5.01.02-2023), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, принимают с учетом Правил по охране труда при выполнении строительных работ.

При высоте откосов более 5 м в однородных грунтах крутизну откосов допускается принимать по графикам, приведенным в приложении Л СП 5.01.02-2023, но не круче указанной в Правилах по охране труда при выполнении строительных работ в строительстве — для выемки глубиной 5 м, а для всех грунтов — не более 80°.

При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна влажными считают грунты, расположенные ниже уровня подземных вод и выше этого уровня на высоту капиллярного поднятия воды, которую принимают, м:

0,3 — для крупных, средней крупности и мелких песков;

0,5 — для пылеватых песков и супесей;

1,0 — для суглинков и глин.

Крутизну откосов карьеров, резервов и постоянных отвалов после окончания производства земляных работ в зависимости от направлений рекультивации и способов закрепления поверхности откосов принимают в соответствии с проектной документацией.

Максимальную глубину выемок с вертикальными незакрепленными стенками принимают с учетом Правил по охране труда при выполнении строительных работ.

Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, при средней суточной температуре воздуха ниже минус 2 °С допускается увеличивать по сравнению с установленной в Правилах по охране труда при выполнении строительных работ на глубину промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

Необходимость временного крепления вертикальных стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, гидрогеологических условий, значений и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий принимают согласно проектной документации.

Количество и размеры ступеней и местных углублений в пределах выемки устанавливают минимальными, обеспечивающими механизированную зачистку основания и технологичность возведения сооружения.

										Лист
										15
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	92/23-ППР				



нии; 3,5 м — при одностороннем движении. При грузоподъемности самосвалов более 120 кН, а также при использовании любых других транспортных средств ширину проезжей части принимают согласно ПОС.

При производстве работ по разработке выемок и устройству естественных оснований состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля принимают в соответствии с СТБ 1164.0, СТБ 1164.1 и с учетом данных таблицы 6.3 СП 5.01.02-2023.

### **7.2.6 Устройство строительного водопонижения легкой иглофильтровой установкой ЛИУ**

Работы производить согласно проектной документации. Установку системы производить специализированной организацией. До начала работ субподрядной организации разработать ППР на устройство водопонижения.

До начала водопонижения должны быть выполнены следующие работы:

- уточнено расположение существующих подземных коммуникаций в зоне работ;
- разработаны водоотводящие каналы вдоль рабочего котлована;
- завезены установки на объект. Доставленные на объект иглофильтровые установки следует распо-

лагать в зоне рабочего котлована.

Иглофильтры устанавливают в грунт гидравлическим способом (способом размыва) при помощи стальных погружаемых (подмывных) труб, соединенных подмывными шлангами с насосом для размыва. При этом образуется скважина, диаметр которой значительно больше диаметра иглофильтра.

Зазор, между грунтовой стенкой скважины и иглофильтром, образовавшийся в результате размыва, заполняется песчаной обсыпкой. Песчаную обсыпку иглофильтров следует не доводить на 1 м до поверхности земли

В оставшейся части зазора устраивается глиняный тампон для предотвращения прорыва воздуха в прифильтровую зону. Это сводит к минимуму разуплотнение грунта вокруг скважины и повышает эффективность водопонижения.

Гидравлическое погружение иглофильтров применяется в любых песках: от мелких до крупных и гравелистых. При наличии гравелистых прослоек, сильно поглощающих воду, к трубе, по которой подается вода для размыва грунта, присоединяют шланг для подачи от компрессора сжатого воздуха. При наличии прослоек или включений грунта, не допускающих применения размыва, иглофильтры устанавливают в скважины, устроенные способом механического бурения или вибропогружения. При прохождении прослоек плотных грунтов не следует вдавливать наконечник иглофильтра в грунт. Необходимо периодически приподнимать и опускать иглу.

При гидравлическом погружении иглофильтров и необходимости устройства обсыпки расход подмывной струи и скорость опускания иглофильтра подбирается так, чтобы диаметр каверны по всей высоте был не менее 150 мм. По окончании погружения иглофильтра разработанную размывом каверну вокруг иглофильтра, установленного на проектной глубине, следует промыть в течение нескольких минут. Затем расход воды сокращается до минимально возможного, при котором еще продолжается излив воды из устья, а в затрубный зазор равномерно засыпается песчано-гравийная смесь.

Если таким способом выполнить обсыпку не удастся, то возможно предварительно погрузить в грунт гидравлическим способом обсадную трубу диаметром не менее 150 мм. В эту трубу опускается собранный иглофильтр, кольцевое пространство между трубой и иглофильтром постепенно заполняется обсыпкой, а затем труба извлекается. При установке иглофильтров в предварительно пробуренные скважины обсыпка выполняется одновременно с извлечением обсадных труб.

Перед погружением фильтр обматывают двумя слоями стеклохолста, который закрепляют вязальной проволокой, намотанной по спирали на холст.

Перед погружением иглофильтр устанавливают вертикально. При длине иглофильтра до 5 м его установку можно производить вручную, при длине более 5 м - с помощью крана. Для лучшей промывки затрубного пространства рекомендуется периодически несколько замедлять погружение иглофильтра, придерживая его на весу.

Длина иглофильтров должна быть подобрана так, чтобы фильтровое звено было расположено на предусмотренной проектом отметке. При сборке должна быть обеспечена герметичность соединений звеньев труб. Перед погружением иглофильтра в грунт проверяется исправность соединений, наличие шарового клапана и целостность фильтровой сетки.

Извлечение иглофильтров производится с подмывом для уменьшения сил трения по боковой поверхности иглы.

Иглофильтры устанавливают вертикально на расстоянии не менее 0,5 м от верхнего края котлована, через 0,75-1,0 м друг от друга. После установки внутренней колонны труб зазор между ней и внешней трубой уплотняется сальником. На выступающий конец внутренней трубы надевается резиновый шланг, по которому вода отводится к сливному коллектору.

Установленные в грунт иглофильтры присоединяются к всасывающему коллектору с помощью инвентарных соединительных шлангов, имеющих на концах овальные фланцы.

Резьбовые соединения уплотняются пенькой и суриком, фланцевые - резиновыми прокладками. Общий всасывающий коллектор соединяют с центральной насосной установкой

						92/23-ППР	Лист
							17
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Установка обеспечивает вакуум, который распространяется лишь в полостях коллектора и самого иглофильтра, поэтому верх фильтра должен быть обязательно заглублен ниже расчетного пониженного уровня подземных вод.

Коллекторы и насосные агрегаты должны располагаться на высоте не более 7-7,5 м над дном котлована при залегании водоупора на глубине до 9 м от поверхности земли и на высоте не более 6,5-7,0 м над дном котлована при более глубоком залегании водоупора.

После установки фильтры следует испытать. Для проверки годности установленных иглофильтров в них наливают воду и наблюдают за скоростью снижения столба воды.

Иглофильтры, уровень воды в которых не понижается, следует извлечь, промыть и снова погрузить в грунт.

Фильтры, в которых наблюдается резко замедленное (по сравнению с другими) поглощение воды, следует проверить и переоборудовать. Если этого сделать нельзя, скважины, в которых установлены эти фильтры, должны быть ликвидированы. Извлечение иглофильтров производится также с размывом для уменьшения сил трения по боковой поверхности иглы.

После проверки установленных фильтров следует откачать из них воду до полного ее осветления. Для откачки загрязненной воды из скважин нельзя применять насосы, предназначенные для водопонижения.

К водопонижению разрешается приступать только после:

- внешнего осмотра смонтированной установки;
- подписания акта на скрытые работы по установке иглофильтров;
- осмотра результатов пробного пуска установки;
- проверки надежности источников электроэнергии.

### 7.2.7 Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей

При производстве работ строго соблюдать:

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ»

СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства

Производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций в случаях, установленных законодательством, допускается только после получения письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ. До начала производства земляных работ необходимо уточнить расположение коммуникаций на местности и обозначить соответствующими знаками или надписями. При производстве земляных работ на территории организации необходимо получить разрешение организации на производство земляных работ.

Производство земляных работ в зонах действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством линейного руководителя работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и, в случаях установленных законодательством, под наблюдением работающих организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без применения ударных инструментов. Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.

### 7.2.8 Требование к монтажу сборных железобетонных фундаментов

Все работы выполнять в соответствии с требованиями:

Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ»

СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений

Типовыми технологическими картами согласно перечня.

Фундаментные блоки следует устанавливать на выровненный до проектной отметки слой песка. Отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать минус 15 мм.

Установка блоков фундаментов на покрытое водой или снегом основания не допускается.

Монтаж блоков стен следует выполнять с соблюдением перевязки в смежных рядах. Минимальный размер перевязки блоков принимают не менее ширины блока, если в проектной документации не установлено другое.

Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

Монтаж блоков фундаментов выполняется на цементно-песчаном растворе в швах, вертикальные шпонки между торцами блоков замоноличивают бетоном. Марка раствора и класс бетона должны соответствовать указанному в проектной документации.

									Лист
									18
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата	92/23-ППР			

В местах примыкания внутренних стен к наружным стенам горизонтальные швы армируются в соответствии с требованиями проектной документации.

При монтаже блоков фундаментов и стен подземной части зданий предельные отклонения показателей качества не должны превышать значений, приведенных в таблице 6.1 СН 1.03.01-2019.

### 7.2.9 Технология монтажа фундаментных блоков

Все работы выполнять в соответствии с требованиями:

Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ»

СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений

Доставка материалов производится с помощью бортового автомобиля

Монтаж блоков производится с помощью автомобильного крана КС 55713-1К-4

До начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

До начала монтажа фундаментных блоков должны быть выполнены следующие мероприятия и работы:

- разработан котлован под здание;
- устроена щебеночная или песчаная подушка под фундамент (согласно проекта);
- устроена бетонная подготовка под фундамент;
- отобраны конструкции, прошедшие входной контроль;
- спланированы и подготовлены площадки для складирования фундаментов;
- фундаменты завезены и разложены в зоне работы крана;
- произведена разбивка мест установки фундаментов;
- доставлены в зону монтажа необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты.

Разметку мест монтажа фундаментных блоков производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей X и Y. Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке, указанной в рабочих чертеж

Геодезист при помощи теодолита переносит оси на обноску с закреплением их двумя гвоздями, забитыми в доски обноски, промежуточные оси переносят способом линейных измерений. Натянув между гвоздями проволоку, получают фиксированные оси установки фундаментных блоков. С натянутой проволоки при помощи отвеса оси переносят на подготовку, где фиксируют забитыми деревянными кольшками или металлическими штырями. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям действующих ТНПА.

При монтаже плит фундаментов предварительно от точки пересечения осей метром отмеряют проектное положение наружной грани плиты и забивают два металлических штыря так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка была расположена в 2...3 мм за линией плиты фундаментов. После разметки положения плит на подготовке и снятия проволоки по осям приступают к их монтажу

Плиты фундамента начинают монтировать с маячных плит по углам и в местах пересечения стен. После этого шнур-причалку поднимают до уровня верхнего наружного ребра плит и по ней располагают все промежуточные блоки

Стропальщик, застропив железобетонную плиту фундамента четырехветвевым стропом, подает команду машинисту крана поднять её на высоту 0,2...0,3 м и проверяет надежность строповки, затем уходит из опасной зоны, даёт команду машинисту крана продолжать подъем, контролируя при этом перемещение элемента на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.

При приближении плиты к зоне монтажа машинист крана звуковым сигналом предупреждает монтажников о необходимости выхода из опасной зоны. Когда плита оказывается на высоте 0,2...0,3 м от проектного положения, монтажник дает команду машинисту крану опустить плиту на подготовленное основание. При необходимости плиту ломом пододвигают в проектное положение при натянутых стробах. Убедившись, что положение плиты соответствует проектному, монтажник дает команду машинисту крана ослабить стропы и снимает их.

На боковых гранях плит устанавливают деревянную опалубку в одну доску по высоте выступающей над верхней плоскостью плит не менее чем на 50 мм. В опалубке устраивают горизонтальную гидроизоляцию, по ней сверху цементно-песчаную стяжку толщиной 30 мм, а в стяжку укладывают арматурную сетку с диаметром стержней не менее 5 мм. Этот армированный шов служит для более равномерного распределения нагрузки от вышележащих блоков и конструкций.

По завершению устройства армированного шва целесообразно засыпать котлован до верха смонтированных фундаментных плит.

Монтаж фундаментных блоков стен начинают с установки маячных блоков, т.е. с крайних расположенных на расстоянии 5,0 м друг от друга. Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

								Лист
							92/23-ППР	19
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата			




#### Установка маячных блоков и натягивание причалки

К установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте. После установки маячных блоков на уровне их верха натягивают шнур-причалку, по которому устанавливают рядовые блоки.


Подготовкой блока к монтажу и его подачей занимается монтажник 3 разряда имеющий смежную профессию - стропальщик. Он стропует блок, проверяет правильность зацепки, очищает от грязи и наплывов бетона, а убедившись, что блок готов к монтажу, отправляет его к месту установки.

Проверка, строповка блока и очистка его нижней плоскости. Монтажник, проверив маркировку, геометрические размеры фундаментных блоков и надежность монтажных петель, при необходимости выправляет их ломом или молотком, стропит блок.

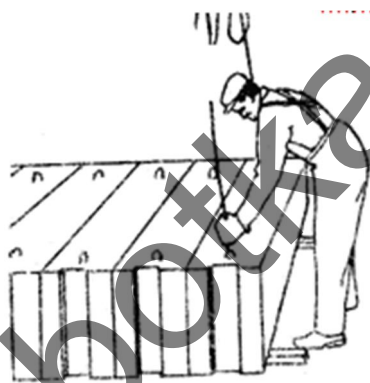

#### Строповка блока

Подача блока к месту укладки. По сигналу монтажника машинист крана приподнимает блок на высоту 50-70 см. Убедившись в надежности строповки и очистив от грязи и наледи нижнюю плоскость блока, монтажник подает сигнал к дальнейшему подъему и перемещению блока к котловану.

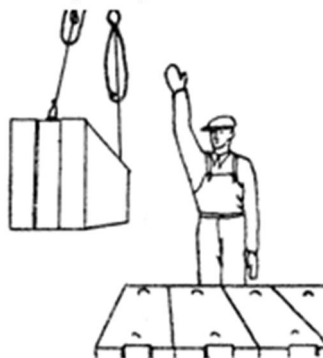


#### Подъем блока

Монтажник 4-го и 3-го разрядов готовят место установки блока: используя в качестве ориентиров деревянные колья, предварительно забитые на проектную отметку основания блока, лопатами выравнивают основание. Монтажник 3-го разряда лопатой расстиляет раствор по опорной поверхности, а монтажник 4-го разряда разравнивает его слоем толщиной 20-30 мм. Полосы раствора должны отстоять от граней блока на 30-40 мм.

Прием и укладка блока на место. Монтажники принимают блок на высоте 200...300 мм от поверхности основания, ориентируют его в нужном направлении и разрешают машинисту крана опустить блок на подготовленную постель.

В правильности установки удостоверяются, используя осевую проволоку, натянутую на обноске (эта проволока фиксирует линию края блока).

								Лист
								20
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата		92/23-ППР	

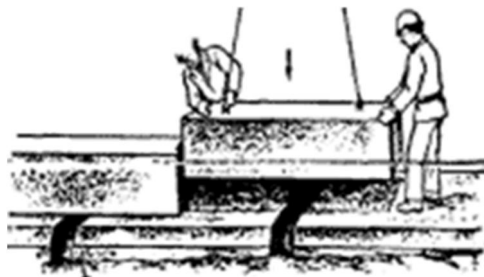

Укладка блока

Выверка блока и расстроповка блока. Монтажники проверяют горизонтальность уложенного блока уровнем, а вертикальность граней - отвесом. Положение блока относительно ранее уложенных проверяют по причалке, а выравнивают с помощью ломов и клиньев при натянутом стропе. Положение фундаментного блока по высоте выверяют с помощью нивелира. Положение блока в плане проверяют при неснятых стропях путём совмещения рисок (установочных и разбивочных осей) по двум взаимно перпендикулярным осям, небольшое отклонение устраняют, передвигая блок монтажным ломиком. Монтажники ломом рихтуют блок по отметкам и причалке, устанавливая его в проектное положение; после чего машинист опускает блок на опорную поверхность. Затем монтажники освобождают строп и производят окончательную выверку уложенного блока.



Подача стропа к следующему блоку. Машинист крана по сигналу монтажника, плавно поднимает строп и отводит стрелу к месту складирования блоков

Заделка швов. Монтажник 3-го разряда заполняет вертикальный стык бетонной смесью, а затем, подштопкой уплотняет раствор в горизонтальном шве

Вертикальные и горизонтальные швы должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

При производстве монтажных работ в зимний период предусмотрены следующие мероприятия:

1. необходимо очищать конструкции, сопряжения и стыки от снега, инея и наледи
2. сварные соединения следует выполнять со специальной предварительной подготовкой, согласно требованиям действующих ГНПА.
3. Для заделки стыков применять смеси с противоморозной добавкой

#### 7.2.10 Обратная засыпка пазух фундаментов

Обратную засыпку пазух фундамента производить погрузчиком

Уплотнение грунта производится дорожными катками и пневматическими трамбовками.

Обратная засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов.

Засыпку пазух в глинистых грунтах следует доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым, а в узких пазухах (где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемого состояния имеющимися техническими средствами) еще и малосжимаемым с применением ручного уплотнения.

Обратную засыпку узких пазух, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, следует выполнять только малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными промышленными отходами с проливкой водой, если в проектной документации не предусмотрено другое решение.

При производстве работ в зимний период обратную засыпку выполнять в течении одной рабочей смены. Мерзлый грунт использовать запрещается.

#### 7.3 Основной период (возведение надземной части здания)

Все работы производить в строгом соблюдении требований:

Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ

СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства

									Лист
									21
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата				

СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений  
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66  
Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов  
Инструкция по охране труда для рабочего при монтаже и демонтаже металлических трубчатых лесов  
Инструкция по охране труда при выполнении работ с лесов и подмостей  
Постановление министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 27 декабря 2007 г. п  
187 Об утверждении межотраслевой типовой инструкции по охране труда при работе на высоте  
Межотраслевых правил по охране труда при выполнении работ на высоте и верхолазных работ (действующая редакция)  
Правила устройства электроустановок 7 издание  
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства  
ТКП 45-1.03-63-2007 (02250) Монтаж зданий. Правила механизации  
Постановление Министерства труда Республики Беларусь 28.04.2001 № 52 Правила охраны труда при работе на высоте

**Важно! Все технологические процессы выполнять руководствуясь действующими типовыми технологическими картами в случае отсутствия актуализированной версии ТТК ее немедленно стоит приобрести, работы без ТТК на все типовые процессы на которые имеются разработанные ТТК запрещены!!! Строго руководствоваться перечнем ТТК данного ППР.**

#### 7.3.1 Выбор монтажного крана на возведение надземной части здания.

Для возведение надземной части здания принимаем автокран КС 55713-1К-4 подобранный для возведения подземной части здания.

#### 7.3.2 Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на возведение надземной части здания.

Монтаж надземной части здания производить автокраном КС 55713-1К-4  
Подвозка материалов осуществляется бортовым автомобилем МАЗ 543205 20 тн  
Доставку бетона осуществлять с помощью автобетоносмесителя АБС-МАЗ 6303  
Наружные отделочные работы проводить с лесов.  
Для работ на высоте дополнительно использовать автовышку АГП12

#### 7.3.3 Расчет опасной зоны работы крана при возведении надземной части здания

Так как работы производятся на минимальной высоте принимает опасную зону крана согласно требований Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ» Приложение 2

Пронос груза над зданием:  
 $L+8\text{м}$   
Где L – рабочий вылет крана.  
Пронос груза над складом:  
 $L+3\text{м}$   
Где L – рабочий вылет крана.  
Опасная зона падения груза со здания: 4м

**Важно! Нахождение посторонних лиц в опасной зоне запрещено! При отрыве груза от земли, стропальщик обязан покинуть опасную зону работы крана.**

**Обязательно выполнять пробный подъем на высоту до 20 см.**

#### 7.3.4 Каменные работы

Все работы выполнять в соответствии с требованиями:

Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. №24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ»

СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений  
Кладка стен осуществляется с подмостей.

Подмости до установки их на объекте должны быть снабжены паспортом организации-изготовителя и испытаны в течении 15 минут под нагрузкой, превышающей расчетную в 2,6 раза. О результатах испытаний должен быть составлен акт.

Доставка кирпича на объект осуществляется в специально оборудованных бортовых машинах на поддонах. К партии должен прилагаться документ, удостоверяющий качество строительной продукции. При погрузке, транспортировании и выгрузки кирпича должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений. Погрузка и выгрузка кирпича должна производиться механизированным способом с помощью такелажных приспособлений. Разгрузку кирпича с автомашины на склад выпол-

									Лист
								92/23-ППР	22
Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата				



**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ  
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В  
ПРИБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР  
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

**+375 (29) 569-06-83**

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

**ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП**

ВЕБ-САЙТ

[www.razrabotka-ppr.by](http://www.razrabotka-ppr.by)


**Разработка ППР для объектов**

**Республики Беларусь**


**Razrabotka PPR by**

# Стройгенплан на основной и подготовительный периоды строительства М1:500


## Схема защитно-охранного ограждения

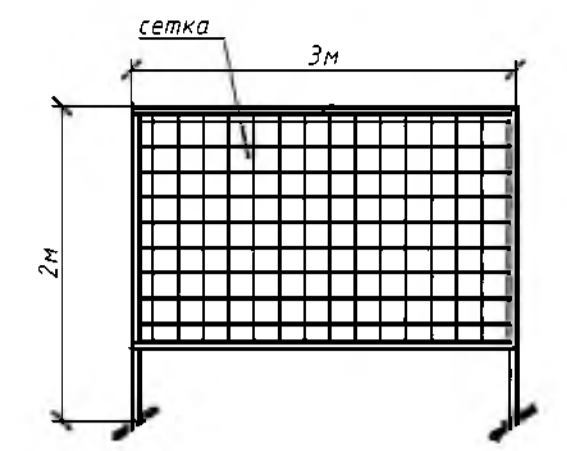

## Схема устройства защитного козырька над входами в здание

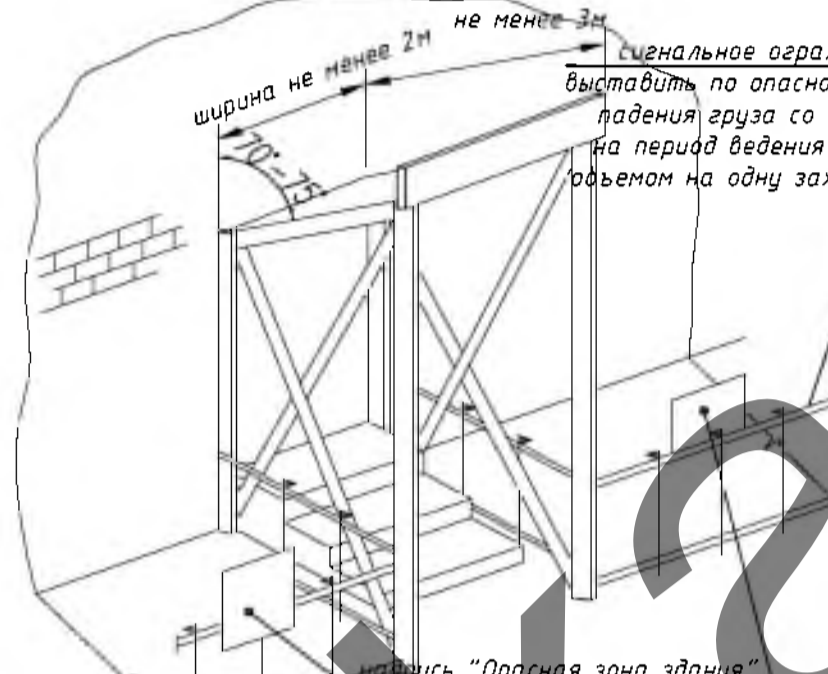

- Утверждаю.**
- Примечание (подготовительный период):
- При выполнении работ старого образца соблюдать требования СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/23 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.12.2016 № 66 «Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов».
  - На участке (заказчик), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
  - При выполнении работ (сооружений) запрещается выполнять работы, связанные с нахождением работников на одной высоте (участке) на эстакадах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и крепление элементов конструкций и оборудования.
  - В процессе монтажа конструкций зданий (сооружений) работники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или скелетах подшивки.
  - Запрещается пребывать работникам на элементах конструкций и оборудовании до момента подъема и перемещения конструкций.
  - Не допускается нахождение работающих под нонитруменными элементами конструкций и оборудования до установкой их в проектное положение.
  - Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий во время дождя, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.
  - Запас кирпича на рабочем месте должен соответствовать 2-х - 4-х часовой потребности. Разбор должен производиться на рабочем месте за 10-15 минут до начала кладки. А в дальнейшем материалами подается по мере их расходования.
  - Масса поднимаемого груза должна быть определена до начала его подъема. Запрещается превышать массу груза, указанную в паспорте грузоподъемности крана. Производится проверка работ в зоне действия крана запрещается. Запрещается выводить краны, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на эстакадах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка, монтаж и временное закрепление элементов конструкций.
  - Выполнение монтажных работ в зоне выполнения монтажных работ методом забивания запрещается.
  - Строительные работы в условиях свечения принимаются в специально оборудованных ящиках, позволяющих подвешивать в них предметы освещения.
  - Производство работ в зимних условиях должно выполняться следующими способами: - комбинированным, при котором сочетаются методы защиты от холода и от обледенения; - комбинированным в естественных условиях (газоной стеной); - замораживанием с последующим искусственным таянием или частичным оттаиванием с применением расходуемых химических добавок.
  - В зимних условиях работы в условиях свечения должны выполняться в соответствии с СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений».
  - Сквозные работы подлежат осуществлению с обеспечением актов по установленной форме. Акты осуществления скрываемых работ должны составляться на завершающий процесс, выполненный соответствующим подразделением.
  - Запрещается выполнение скрываемых работ при отсутствии актов осуществления скрываемых работ.
  - Во время переезда в рабочие технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены на рабочем кране.
  - Подъемники, краны и спускающиеся с них следует только по внутренним лестничным клеткам и оборудованным для этого на кране лестницам.
  - Все строительные-монтажные работы, организация строительной площадки, участок работ и рабочие места должны производиться при строгом соблюдении Специальных требований по обеспечению пожарной безопасности возводимых объектов и пожароопасных производств, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2019 № 779.
  - Курение на строительной площадке допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями места для курения.
- Примечание (подъемная часть):
- Все работы производятся в строгом соответствии с требованиями. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/23 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ», СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», СН 5.01.02-2023 «Устройство оснований и фундаментов», Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.12.2016 № 66 «Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», Основные требования фундаментов СН 5.01.02-2023 «Устройство оснований и фундаментов».
  - Фундаментные блоки следует устанавливать на выровненную до проектной отметки слой песка. Отклонения от проектной отметки слоя песка от проектной не должны превышать более 15 мм.
  - Установка блоков фундаментом на покрытие водой или снегом основания не допускается.
  - Монтаж блоков стен следует выполнять в соответствии с требованиями СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», СН 103.04-2020 «Организация строительного производства», СН 103.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», СН 5.01.02-2023 «Устройство оснований и фундаментов».
  - Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заложены раствором и расшиты с двух сторон.
  - Монтаж блоков фундаментом выполняется на цементно-песчаном растворе в швах. Вертикальные швы между блоками должны замоноличиваться бетоном Марка раствора и класс бетона должны быть указаны в проектной документации.
  - Фундаментные блоки и блоки стен подвоя складируются - в штабеля высотой не более 2,6 м на подвоях и с прокладками.
  - Промос грунта в пределах строительной площадки разрешен с ограничением выноса грунта, согласно схемы строительства.
  - Скорость перемещения грузов при их приложении к границе рабочей зоны на расстояние не менее 7 м и дальнейшее транспортирование должны быть снижены до минимальной.
  - Рельсовые пути в обоих концах рельсового пути, а также концы стальных рельсов должны быть соединены между собой перемычками и присоединены к заземлению (заземлены), образуя непрерывную электрическую цепь.
  - До начала строительства должна быть принята строительная площадка по акту о соответствии выполненных инженерных и геодезических работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии с СН 103.04-2020.
  - В процессе выполнения строительных конструкций, зданий и сооружений необходимо выполнять всевозможные схемы в соответствии с СН 103.01-2019 с составлением исполнительных схем и составлять акты осуществления скрываемых работ и промежуточные акты осуществления работ в соответствии с СН 103.04-2020.
  - Работы по обратной засыпке грунта следует производить только после устройства перемычки над подвоями. Категорически не допускается оставлять подвоя открытыми более 1 мес. - в летних условиях, 2 мес. - в зимних условиях. Технология уплотнения грунта в пазах определяется строительной организацией для обеспечения проектных требований по плотности грунта в пазах с учетом типов и марок уплотняющих машин и механизмов в соответствии с СН 5.01.02-2023.
  - Засыпку пазах в зимних условиях следует выполнять при температуре воздуха не ниже 5°C (где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемого состояния имеющихся технических средств) еще и наосаждениями с применением ручного уплотнения.

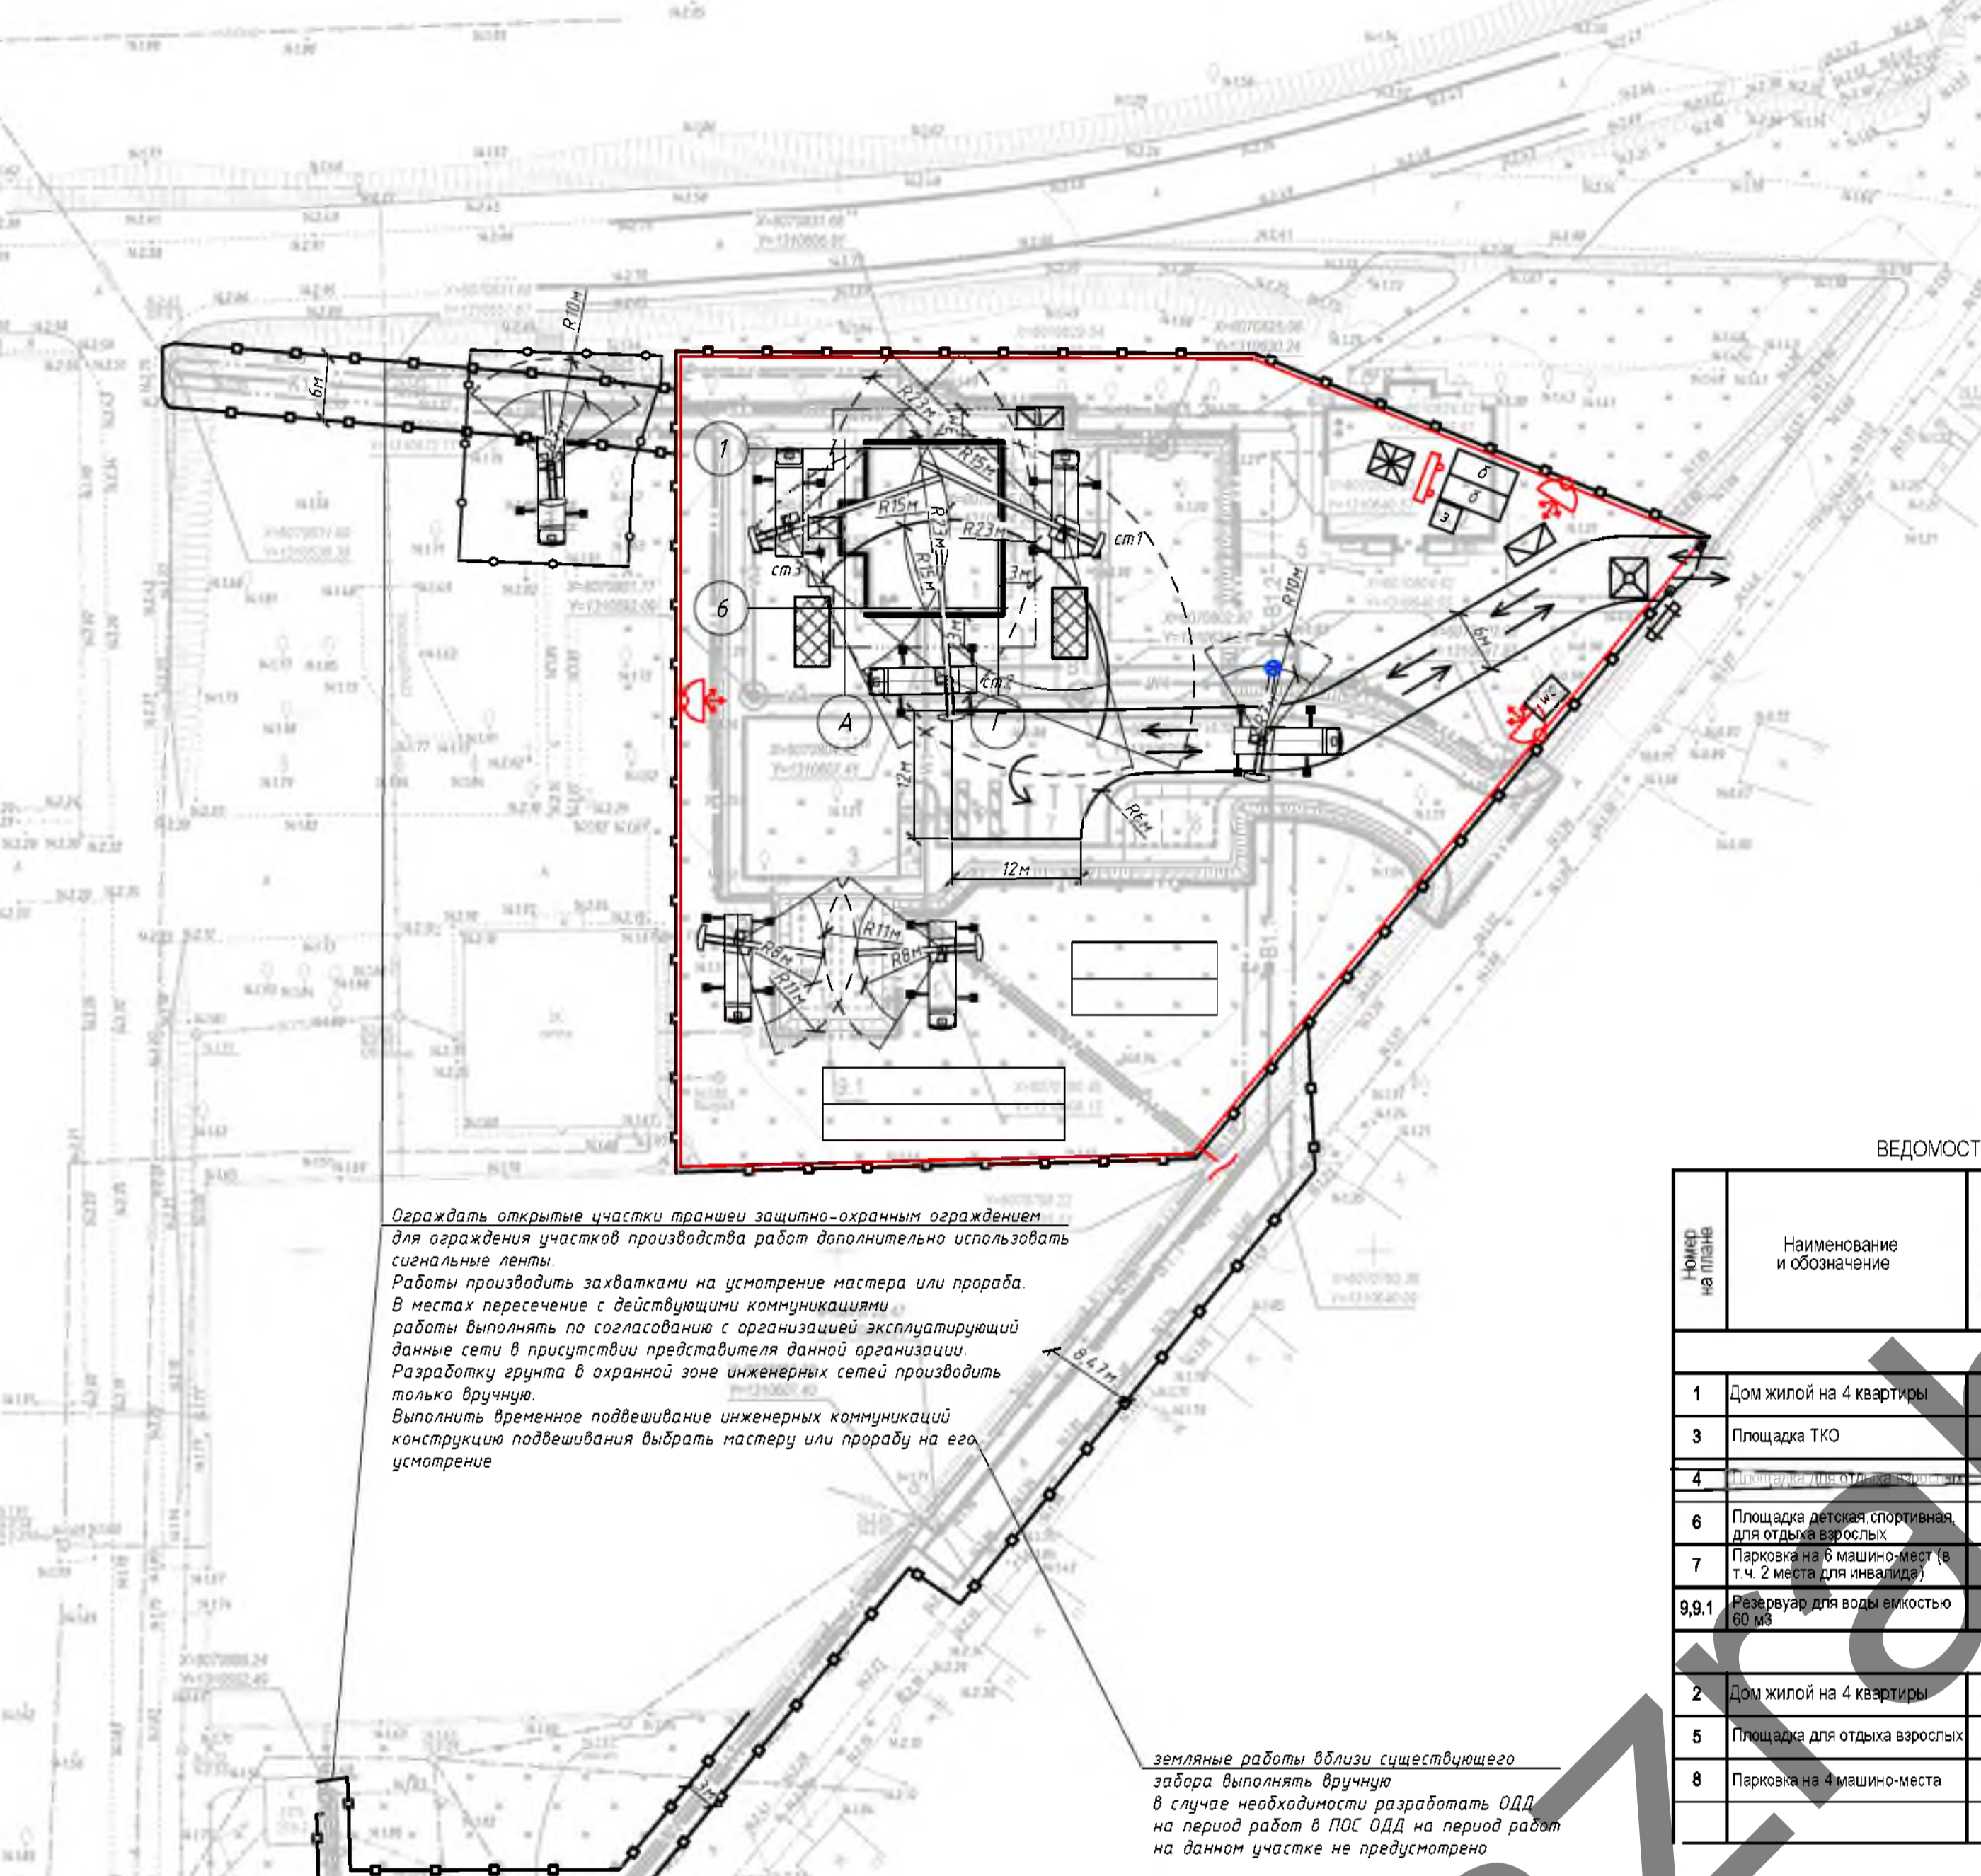

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ п/п на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м <sup>2</sup>		Строительный объем, м <sup>3</sup>	
			квартир	зданий	общая	здания	здания	всего
<b>ПРОЕКТИРУЕМОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>								
1	Дом жилой на 4 квартиры	2	1	4	244,25	244,25	321,01	321,01
3	Площадка ТКО	-	-	-	-	-	-	-
4	Площадка для отдыха взрослых	-	-	-	-	-	-	-
6	Площадка для отдыха взрослых	-	-	-	-	-	-	-
7	Парковка на 4 машино-места (в т.ч. 2 места для инвалидов)	-	-	-	100,75	100,75	-	-
9.9.1	Резервуар для воды емкостью 60 м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>								
2	Дом жилой на 4 квартиры	-	-	-	-	-	-	-
5	Площадка для отдыха взрослых	-	-	-	-	-	-	-
8	Парковка на 4 машино-места	-	-	-	-	-	-	-

Ограждать открытые участки траншеи защитно-охранным ограждением для ограждения участков производства работ дополнительно использовать сигнальные ленты.

Работы производить захватками на усмотрение мастера или прораба.

В местах пересечения с действующими коммуникациями работы выполнять по согласованию с организацией эксплуатирующей данные сети в присутствии представителя данной организации.

Разработку грунта в охранной зоне инженерных сетей производить только вручную.

Выполнить временное подвешивание инженерных коммуникаций конструкциями подвешивания выбрать мастеру или прорабу на его усмотрение.

земляные работы вблизи существующего забора выполнять вручную в случае необходимости разработать ОДД на период работ в ПОС ОДД на период работ на данном участке не предусмотрено


## Массы поднимаемых грузов

№ пп	Наименование	Масса, кг
1	Ящик с раствором	800
2	Бадря с бетоном V <sub>25</sub> при полном заполнении тяжелым бетоном	3000
3	Плита пустотная	2800
4	Лестничные марши	1520
5	Лестничные площадки	1345
6	Фундаментные блоки и плиты	300-1400
7	Поддон с кирпичом	1700
8	Бытовые модули	2500
9	Арматурные каркасы	100
10	Поддон с кирпичом	2000
11	Ящик с раствором	800
12	Шарнирно-панельный подмости	500
13	Перемычки	2000
14	Колодки жб, плиты колодцев	600-1500
15	Опоры освещения	500-1000
16	Деревянные элементы стропильной системы	1000-1500


## Условные обозначения

- сигнальное ограждение (ограждать опасную зону работы строительной техники)
- зона проноса груза краном
- ☒ контейнеры для бытового мусора
- ☒ паспорт объема и схема движения транспорта
- ☒ закрытый склад
- ☒ ворота
- ☒ прожектор освещения строительной площадки
- ☒ б/м биотуалет
- ☒ точка подключения временного водоснабжения
- ☒ б/м бытовой модуль 245х6м
- ☒ пункт очистки колес
- ☒ отвал грунта
- ☒ контейнер для строительного мусора
- ☒ станина автокрана
- ☒ место для курения
- ☒ временное защитное ограждение
- ☒ зона складирования материалов
- ☒ защитный козырек над входом в здание
- ☒ опасная зона падения груза со здания (опасная зона)
- ☒ контейнер для бытового мусора
- ☒ комплект средств пожаротушения (пожарный шланг)
- ☒ опасная зона работы крана


## Ситуационная схема

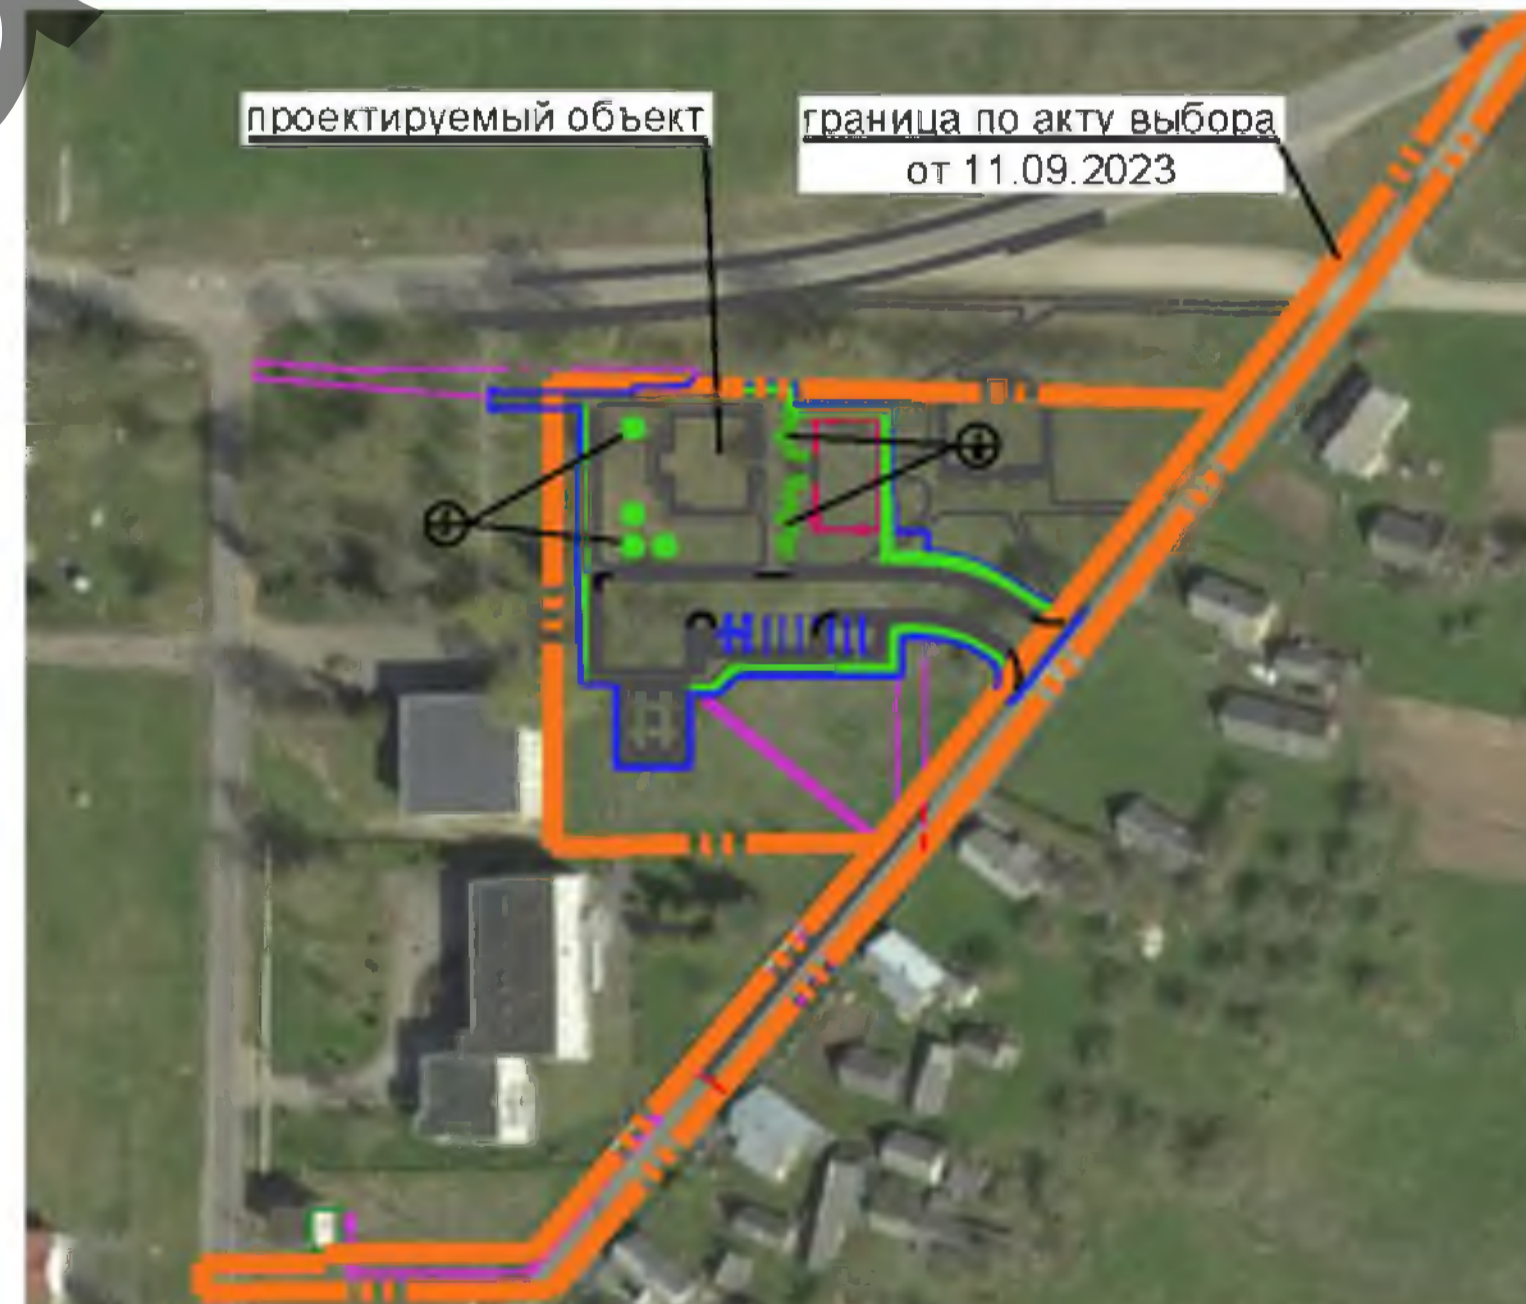

## Характеристики автокрана КС 55713-1К-4

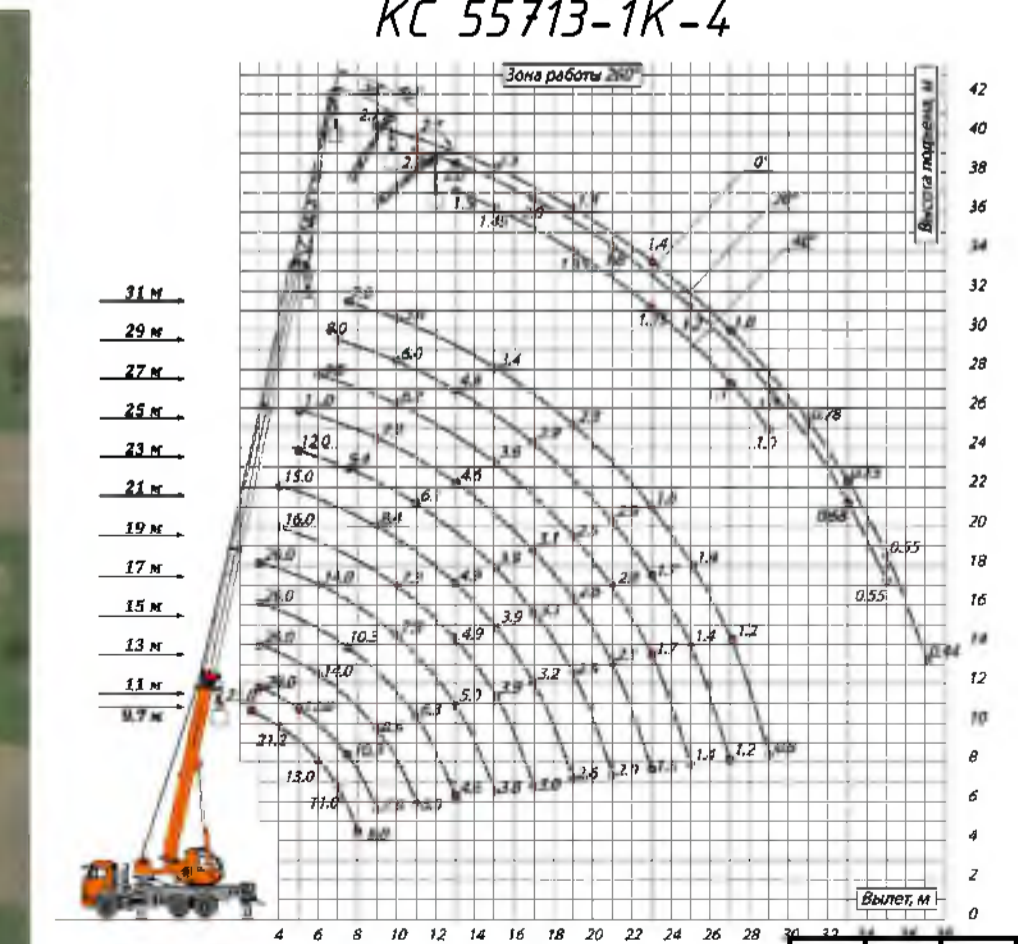

## Сигнальное ограждение

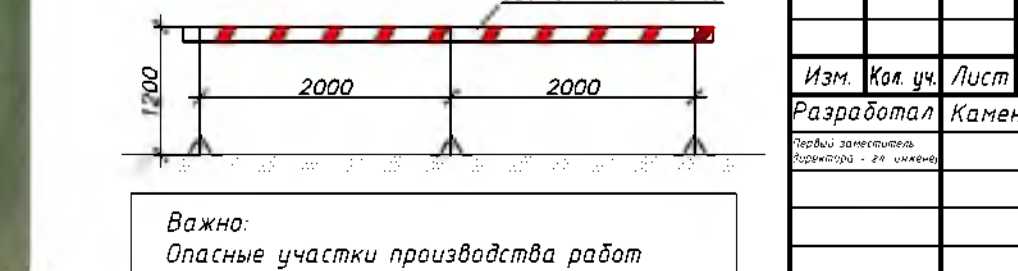

- Примечание (подъемная часть):
- На устройство строительного водопонижения следует субординация организации разработать ППР на устройство системы в соответствии с требованиями проектной документации. Вы должны иметь паспорт системы (или записку от собственника участка), в котором указывается тип системы, ее характеристики и данные о ее эксплуатации.
  - Если автономный установщик для погружки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и зданием автономия (или заборной точкой самовывоза груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,8 м.
  - Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.
  - Переносить материалы на носиках по горизонтальной полу разрешается только в исключительных случаях и на расстоянии не более 50 м.
  - Запрещается переносить материалы на носиках по лестницам и спускам.
  - На участке (заказчик), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
  - Не допускается нахождение людей под нонитруменными элементами конструкций и оборудования до установкой их в проектное положение.
  - Все сигналы подается только одним лицом (вращающ, звенящим, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность. Опасность подвешивания конструкций от арки и навалы необходимо сообщать до их подъема.
  - Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту от 0,2 до 0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.
  - Заранее следует выложить монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, гололеде, аэроз и тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.
  - Работы по перенесению и установке вертикальных панелей и подвоями от конструкций с большой грузоподъемностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.
  - При выполнении работ в зимних условиях должны обеспечиваться сохранение температуры воздуха и пластичности грунта обратной засыпки.
  - Основания котлованов и траншей, разработанные в зимних условиях, должны предохраняться от размораживания путем наброса или укладки утеплителя.
  - Основания, на которых укладывают бетонные смеси, а также температура оснований, температура оснований и конструкций.
  - Строительные сетки должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для предотвращения отклонения механизмов подъема, поворота и выдвигания стрелы на безопасном расстоянии от края прохода линии электропередачи.
  - Установка кранов для выполнения строительных-монтажных и других работ должна производиться с обеспечением безопасных условий, расстояний от сетей и воздушных электрических линий электропередачи.
  - Работодатель, предприятие - владелец грузоподъемного крана или представитель заказчика, а также исполнитель работ должны обеспечить меры безопасности, которые должны быть обеспечены за безопасное производство работ краном, выполнение следующих обязанностей: указывать крановщику место установки строповых кранов для работы вблизи линии электропередачи и выдвигать разрешение на работу с запиской в вахтенном журнале.

92/23-ППР

Кропотливым членом коллектива жилого дома в аг. Кеняшки Островского района




Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Каменский				

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
С	1	5

ООО «Строительное управление №20»

Формат А1

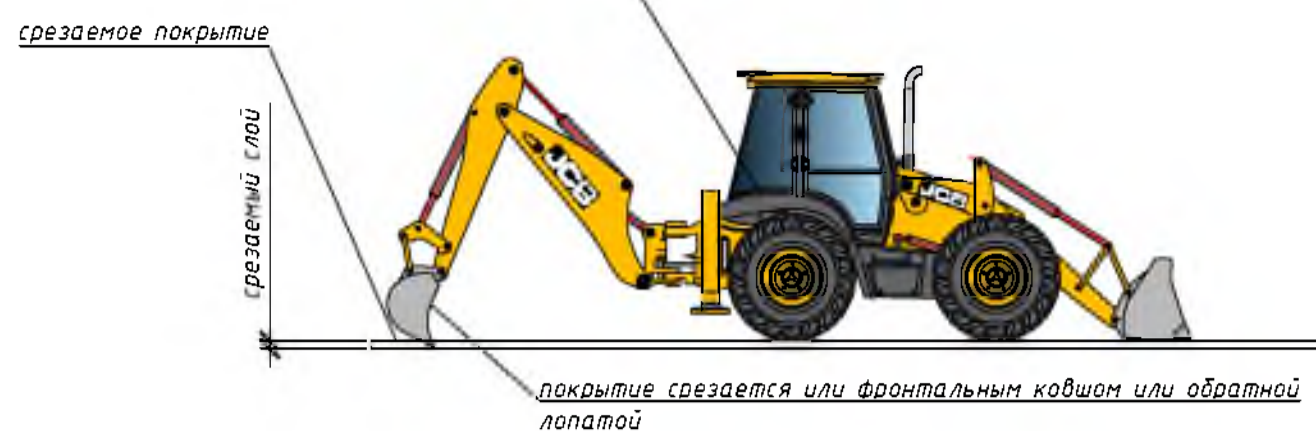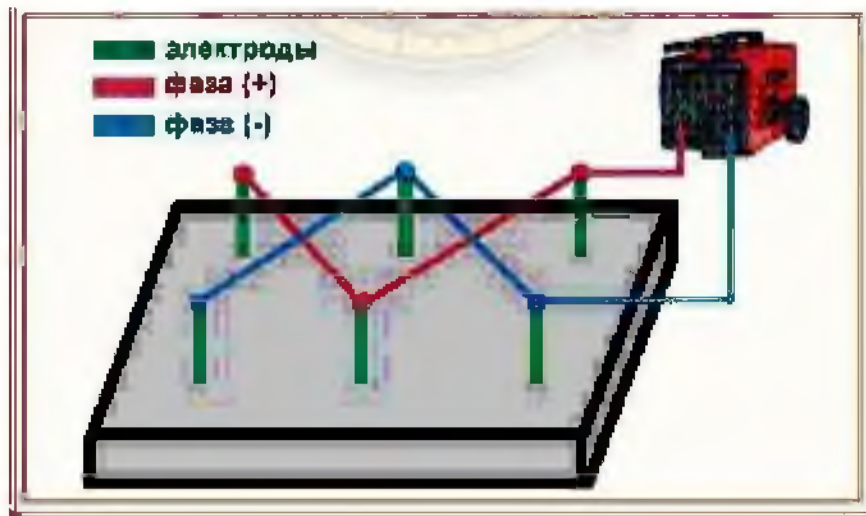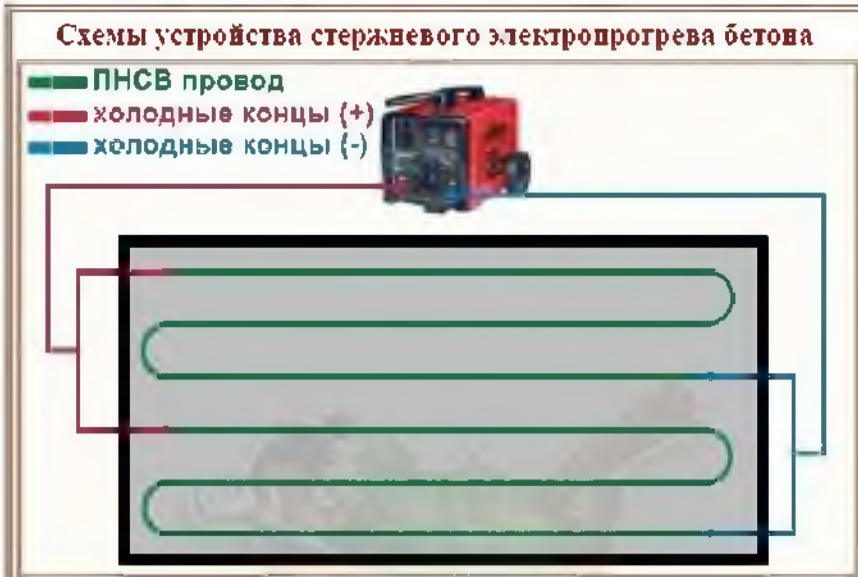

- Примечание:
1. Все работы производить в строгом соблюдении требований: Постановления министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31.03.2019 года утверждения Правил по выполнению строительных работ, СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства, СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений;
  2. С целью исключения разрыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выенок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод;
  3. Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора;
  4. Производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций (электросети, газопроводы и др.) допускается только после получения письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ. До начала производства земляных работ на участке с обнаруженными подземными коммуникациями на местности и обозначить соответствующими знаками или надписями;
  5. При производстве земляных работ на территории действующей организации необходимо получить разрешение руководителя этой организации;
  6. Производство земляных работ в зонах действующих кабелиных линий или газопроводов следует осуществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и под наблюдением работников организации, эксплуатирующей эти коммуникации;
  7. В случае обнаружения при производстве работ коммуникаций, подземных сооружений не указанных в проекте, или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения от соответствующих органов;
  8. Перед началом производства земляных работ на участках с обнаруженным загрязнением почвы (свалки, скотомогильники, кладбища и т. п.) необходимо получить разрешение органов и учреждений, осуществляющих государственственный санитарный надзор;
  9. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без применения ударных инструментов. Применение землеройных машин в местах пересечения выенок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организацией -- владельцами коммуникаций;
  10. При размещении рабочих мест в выенках их размеры, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах -- также необходимое пространство в соответствии с картой трудовых процессов;
  11. Выенки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 23407. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время -- сигнальное освещение;
  12. Для прохода на рабочие места в выенки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы. Приставные лестницы должны быть прочно закреплены и на 1 м возвышаться над выенкой. Трапы (маршевые лестницы) должны иметь поручни высотой 1,1 м;
  13. Не допускается производство работ одним человеком в выенках глубиной 1,5 м и более;
  14. Не разрешается разрабатывать грунт в выенках «подколом»;
  15. На участке (законате), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц;
  16. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудованием до установки их в проектное положение;
  17. При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих;
  18. Расчистка для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к надежному опору. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы наложения и места закрепления устанавливаются ППР;
  19. Расчистки должны быть расположены за пределами захватной зоны транспорта и строительных машин. Расчистки не должны касаться остриев углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах сопряжения их с элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок;
  20. Элементы монтируемых конструкций или оборудования до момента перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения задними оттяжками;
  21. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и нацистом крана;
  22. Все сигналы подается только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность;
  23. В особо ответственных случаях (при подъеме с применением сложного такелажа, метода поворота, при наливке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т. п.) сигналы должен подавать только руководитель работ;
  24. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и тегов, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж;
  25. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема;
  26. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и бросания;
  27. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту от 0,2 до 0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем;
  28. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали -- не менее 0,5 м;
  29. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу;
  30. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, гололеде, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ;
  31. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подовых их конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более;
  32. При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять требования, предъявляемые к монтажным работам;
  33. Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей ЛЭП следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии письменного разрешения организации -- владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия;
  34. Кладка стен каждого вышеупомянутого этажа многоэтажного здания должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках;
  35. При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м и внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания выделять опасную зону разреженным панельным ограждением высотой 1,2 м в соответствии с требованиями ГОСТ 23407, а высотой до 7 м -- сигнальным ограждением в соответствии с требованиями ГОСТ 124.026;
  36. Граница опасной зоны устанавливается на весь период возведения здания с учетом его высоты и определяется в Приложении 2 Правил по охране труда при выполнении строительных работ;
  37. При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме, и изготовленные в установленном порядке;
  38. Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки необходимо в специально выделенных местах, где не участвуют находящиеся лица, не участвующие в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами;
  39. Кладку стен необходимо вести междуэтажными перекрытиями или средств подмащивания;
  40. Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать требованиям Главы 10 Правил по охране труда при выполнении строительных работ;
  41. Запрещается выполнять кладку стен со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене;
  42. Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 0,3 м, следует осуществлять с наружных лесов, имеющих ширину рабочего настила не менее 2 м;
  43. При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждение (улаволивающее) устройство, а при невозможности их применения -- предохранительный пояс;
  44. Расчистку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытиями или подмостями после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой операции;
  45. Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий до времени грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более;
  46. В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить за ними постоянное наблюдение. Пребывание в здании (сооружении) лиц, не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается;
  47. При электропрогреве каменной кладки прогреваемые участки должны быть ограждены и находиться под наблюдением электромонтера;
  48. Не допускается дести кладку на участках электропрогрева, а также применять электропрогрев в сырую погоду и во время оттепели.

Схема крепления страховочных поясов при ведении ведения каменных работ



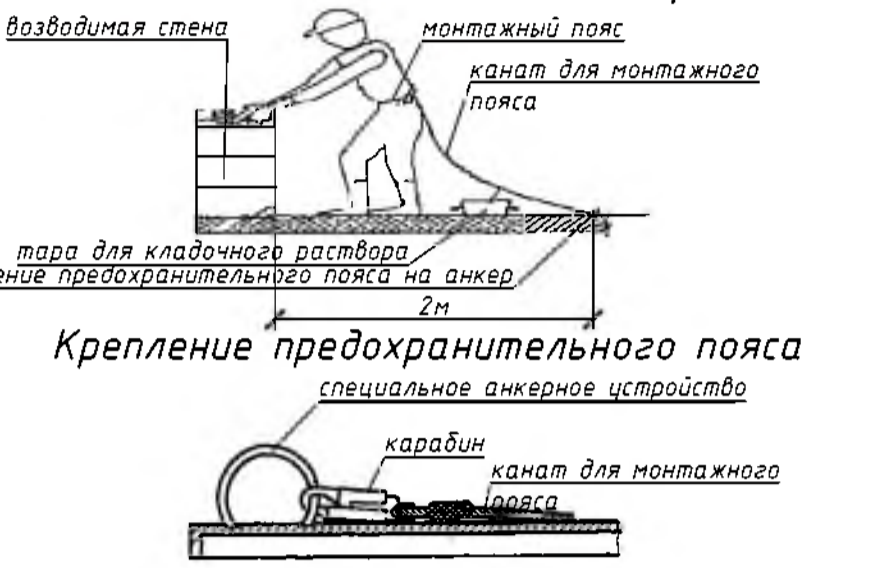


Схема разбивки кладки по ярусам

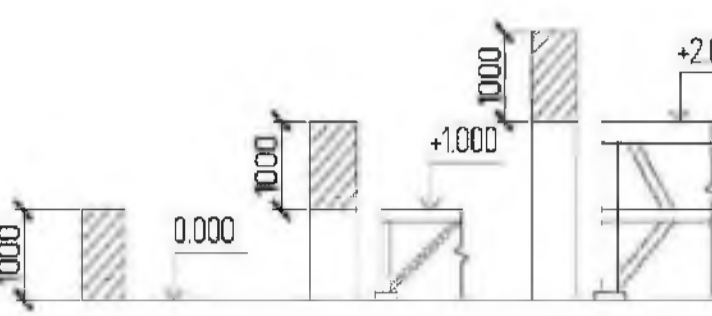

Организация работ при монтаже жб элементов

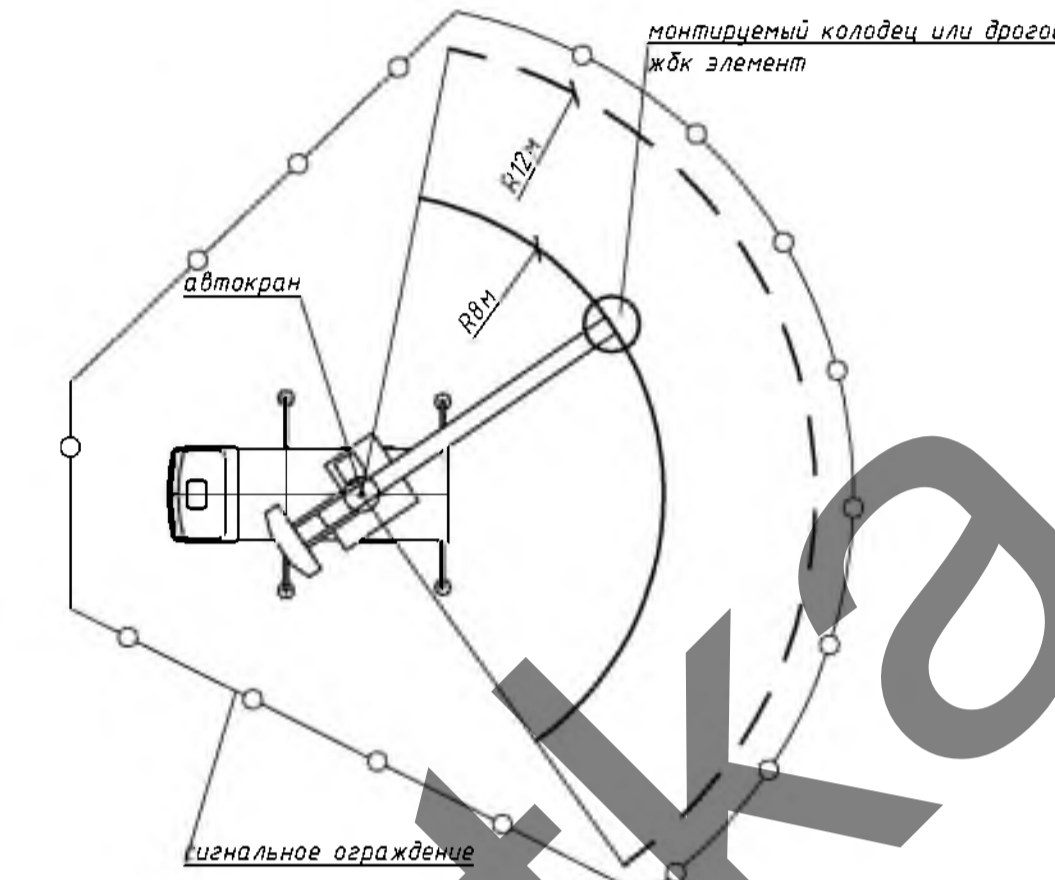

Организация рабочего места при производстве каменных работ

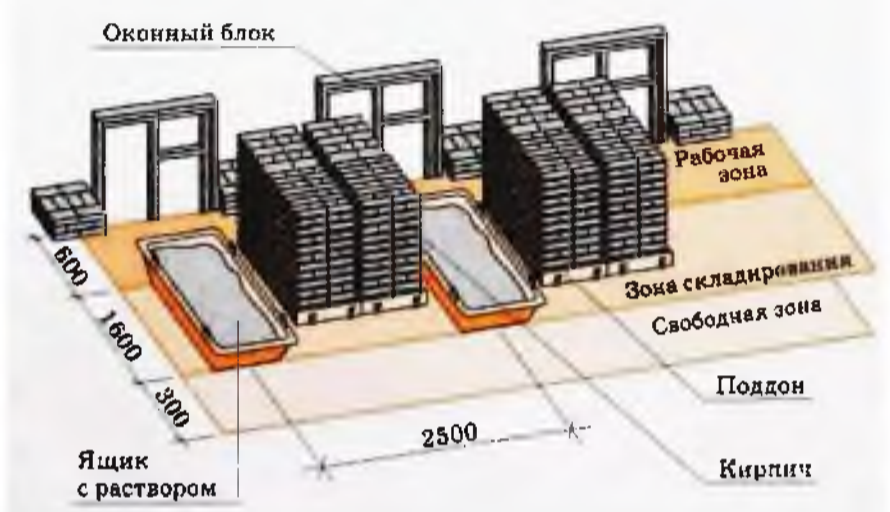


Схема страховки при монтаже плит перекрытия

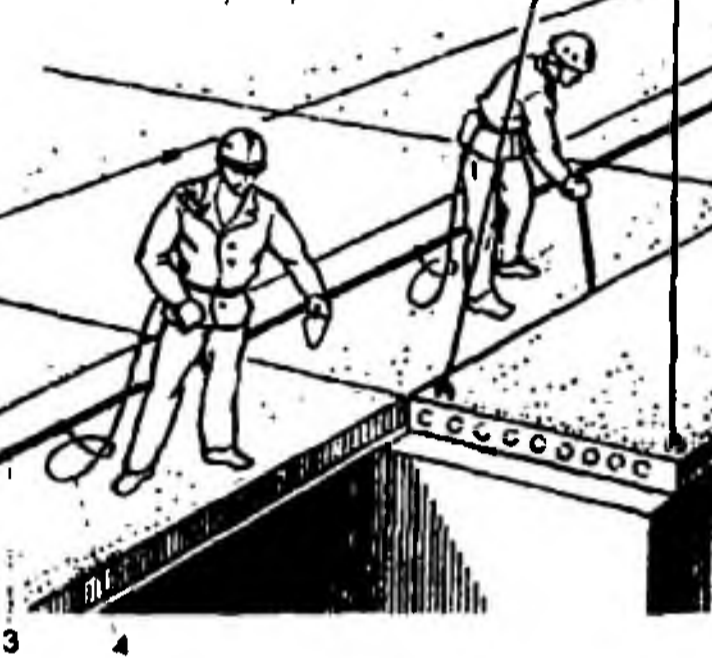


Схема производства работ по монтажу трубопровода

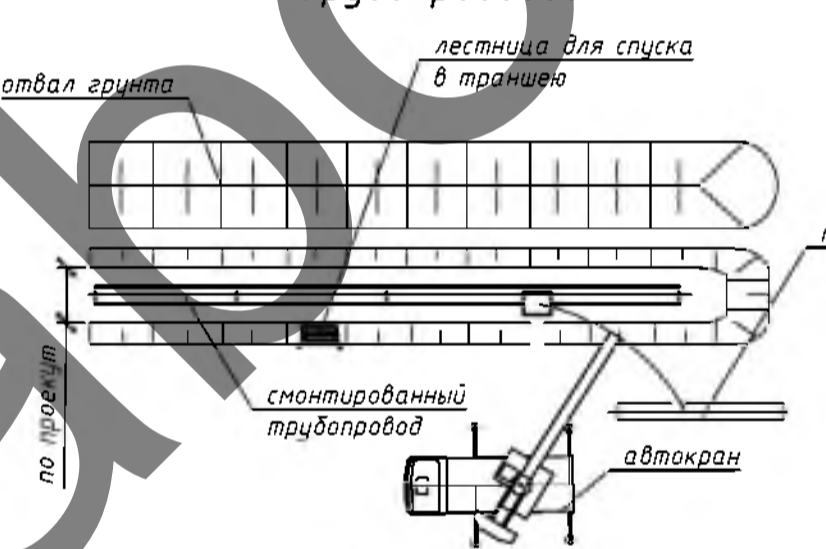


Схема лобовой проходки экскаваторного забоя

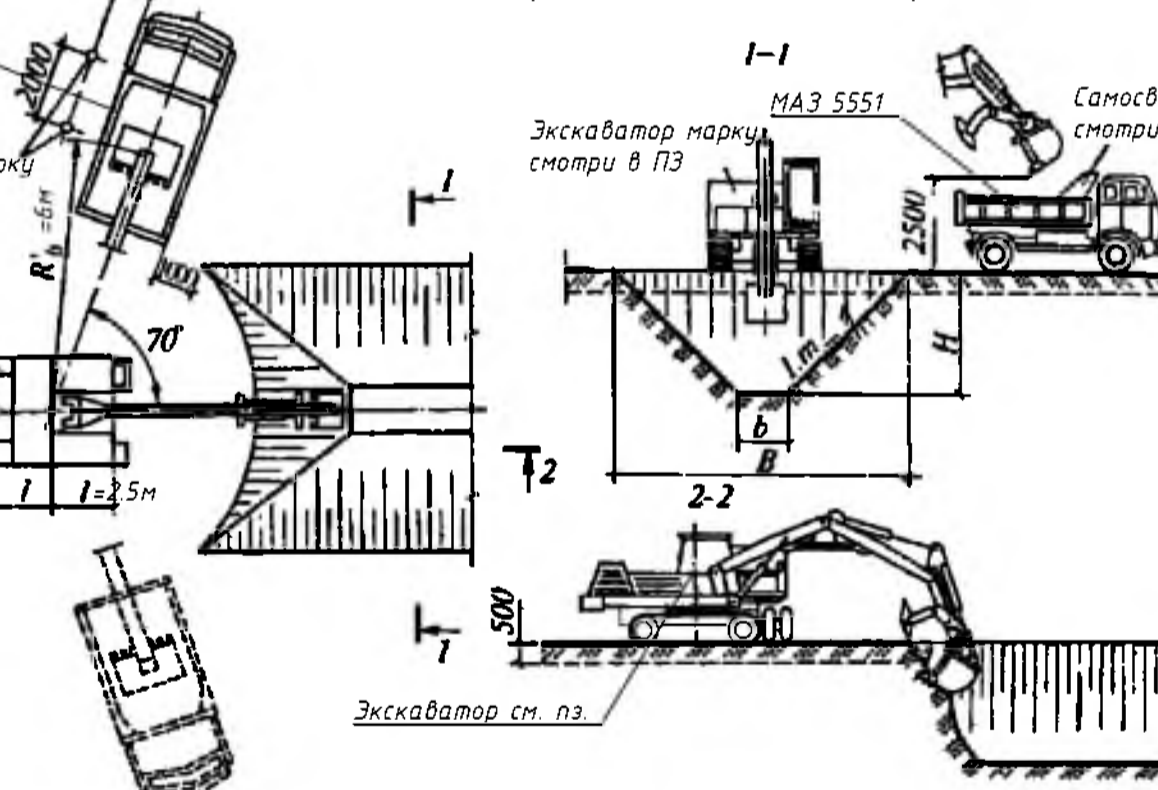


Схема монтажа жб колодцев краном

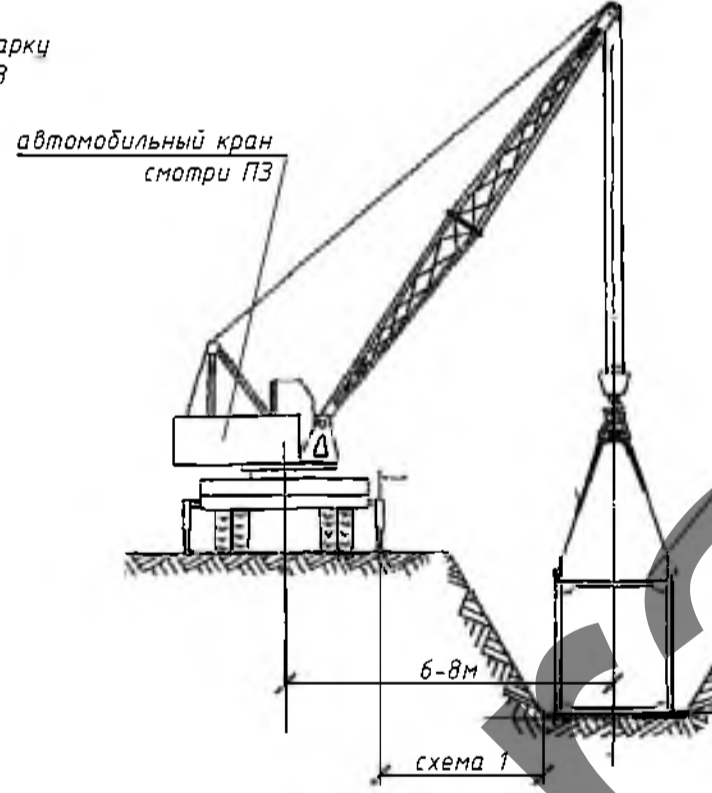


Схема уплотнения бетонной смеси


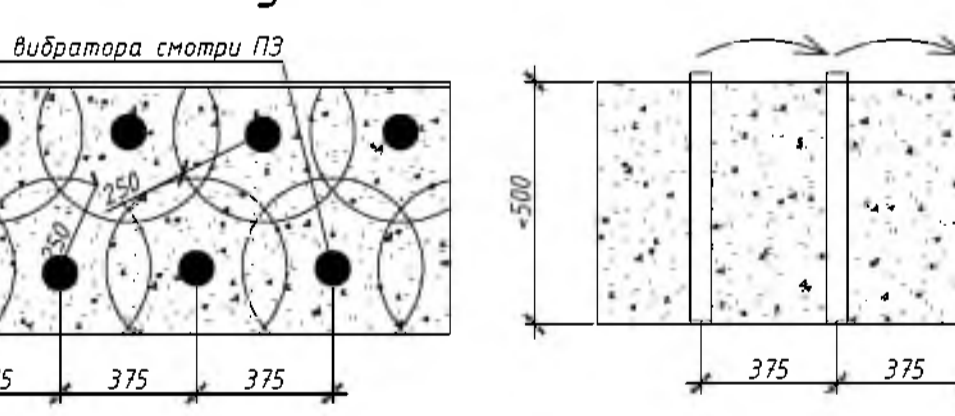


Схема организации рабочего места при проведении кровельных работ на скатных кровлях

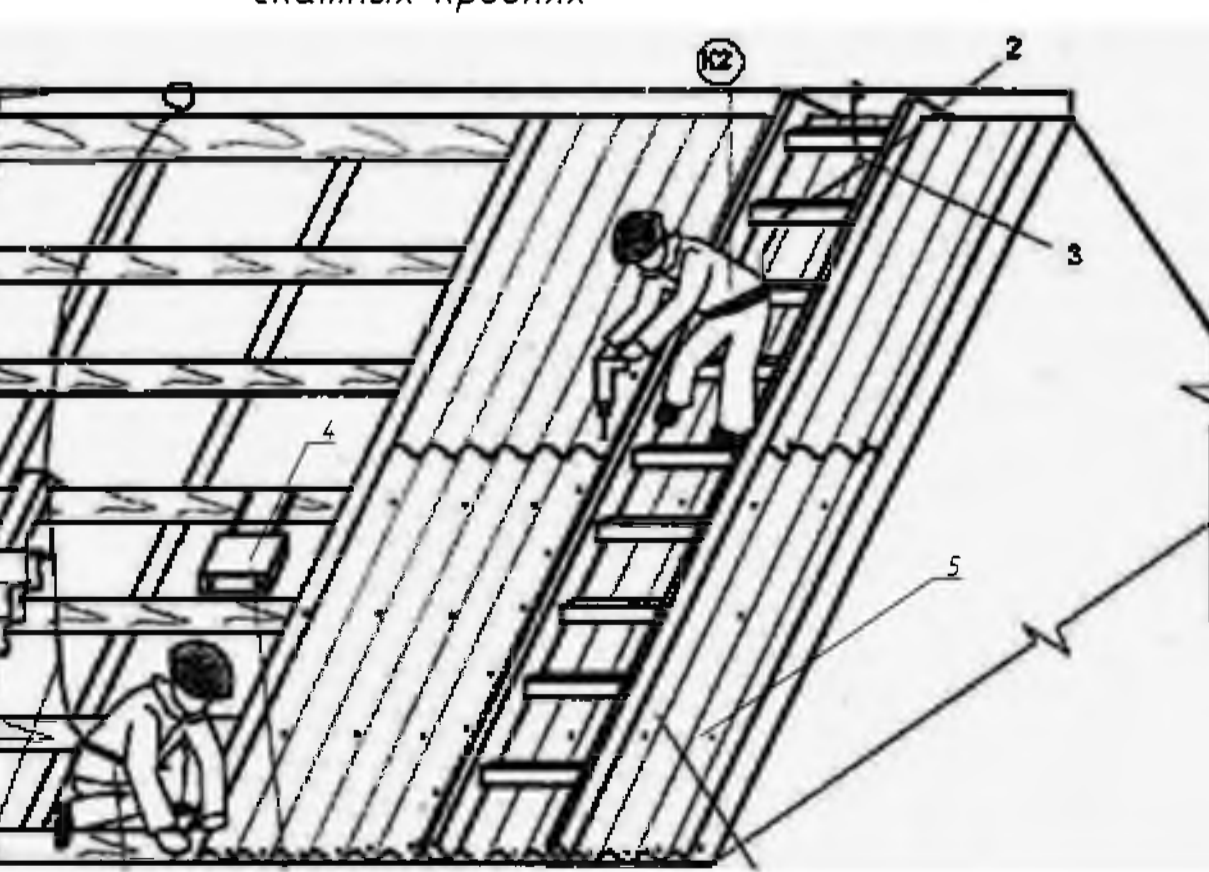

Выемка грунта погрузчиком

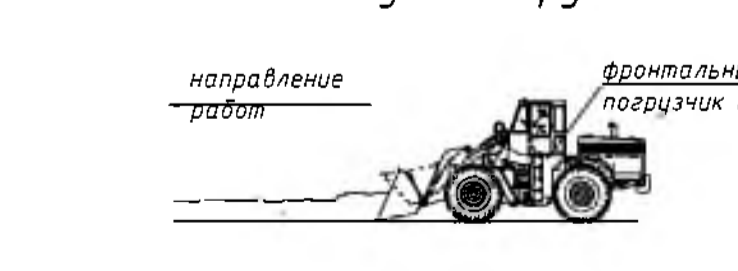


Схема уплотнения грунта вибралитой



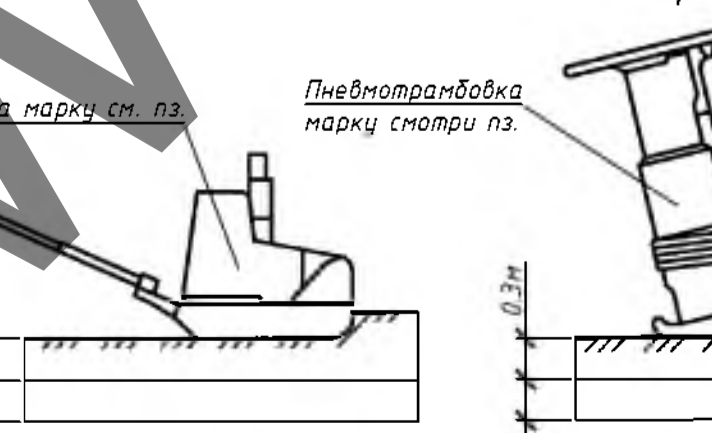



Схема уплотнения грунта пневмотрамбовкой

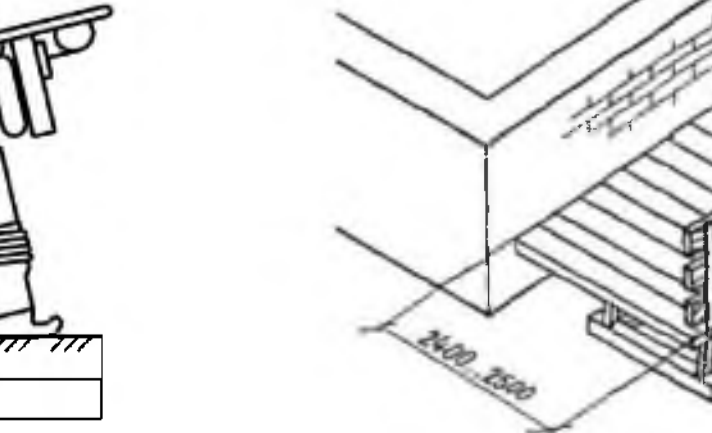

Погрузка грунта в самосвал

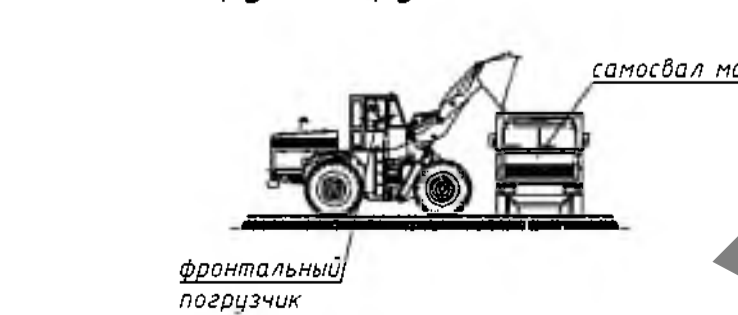


Установка шарнирно-панельных подмостей 2-3 яруса

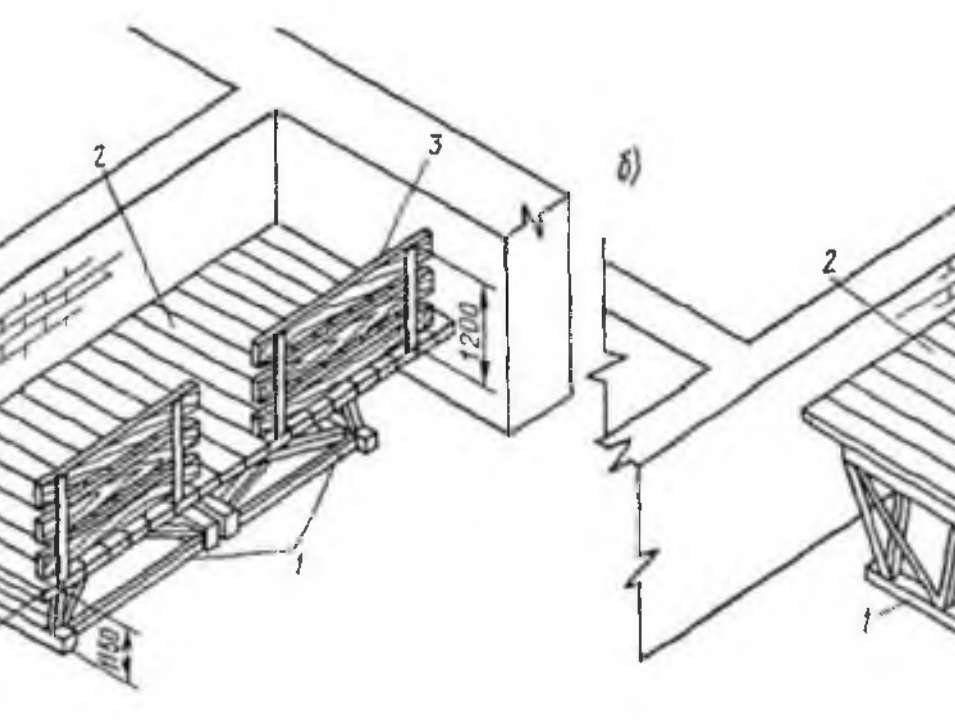

1 - треугольные опоры; 2 - рабочий настил; 3 - ограждение

92/23-ППР			
проектирование четырехквартирного жилого дома в аг. Кемельши Островского района			
Изм.	Кол. экз.	Лист № док.	Подп.
Разработал	Каменицкий		
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ			Стadia
Схемы производства работ			Лист
			Листов
			5
ООО «Строительное управление №202»			
Формат			A1

Схема безопасности при работе одноковшовым экскаватором

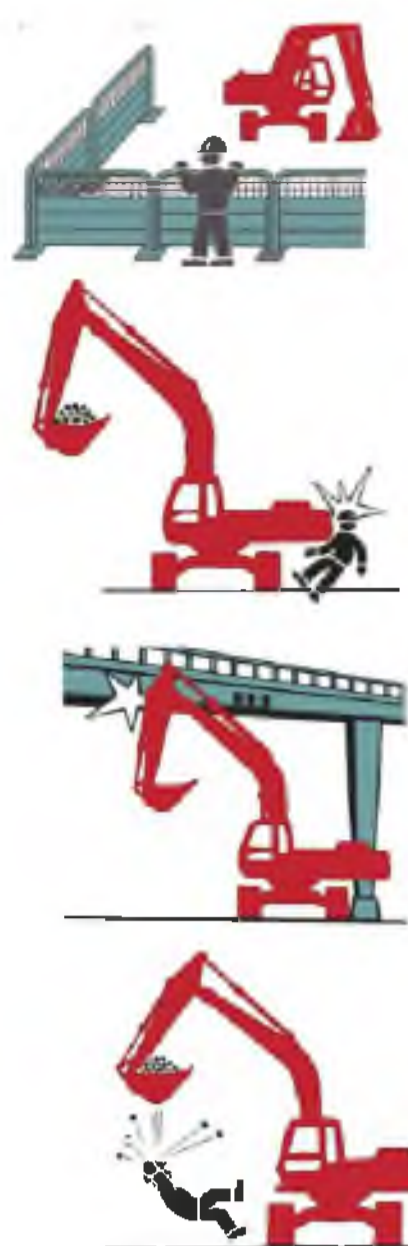

Проверьте, установлено ли сигнальное ограждение рабочей зоны сзади с кошкой в радиусе действия ковши экскаватора. Если ограждение не установлено, следует его установить!

Прежде чем начинать любое движение экскаватора или платформы, убедитесь, что в опасной зоне сзади с кошкой нет людей! Дайте сигнал!

Осмотритесь, нет ли в зоне действия стрелы и ковши экскаватора сооружений и конструкций, препятствующих работе и опасных при соприкосновении с ними.


Никогда не заносите ковш экскаватора (с грузом или без груза) над людьми.

Средства индивидуальной защиты рабочих



Важно! Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить каски защитные, застегнутые на подбородочные ремни. Работющие без касок защитных и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Безопасная привязка техники к низу котлована

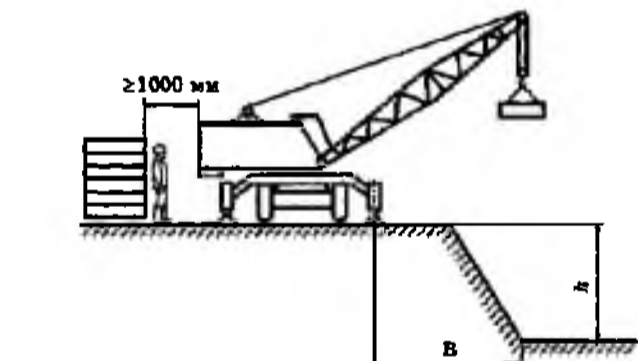


Глубина котлована (козла), м	Груз		Грузовая цепь	Грузовый канат	Грузовый канат
	весовый	статический			
1	1,5	1,25	1,0	1,0	1,0
2	3,0	3,4	3,0	3,0	1,5
3	4,0	3,6	3,25	3,5	1,75
4	5,0	4,4	4,0	3,0	3,0
5	6,0	5,3	4,75	3,5	3,5

Схема страховки при работе в люлке



Правила работы на высоте

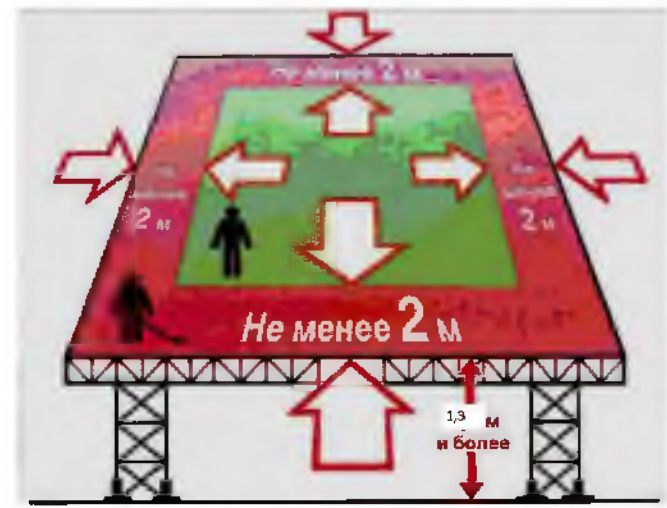

на перепадах высот, которые не имеют ограждения, следует использовать страховочную привязь при работе на расстоянии 2 м от перепада высот

- Не использовать в качестве приставной лестницы
- Одновременно на высоте не находиться только одному человеку
- Не использовать в качестве подпостей
- Категорически запрещается подниматься на предохранительный упор
- Наклоняться только в сторону предохранительного упора
- Не работать на неровной поверхности
- Категорически запрещается подниматься на предохранительный упор
- Не работать вблизи открытого окна
- Не работать вблизи незапертой двери
- Не работать под напряжением

Порядок монтажа строительных лесов ЛРСП-300


I этап

На подготовленной площадке (выровненной и утрамбованной) установить деревянные подкладки с шагом 3 м. Установить опорные пяты или винтовые опоры на деревянные подкладки, так, чтобы основания рам лесов находились в одной горизонтальной плоскости.

II этап

В опорные пяты установить две смежные рамы первого яруса, соединить их сдвоенной диагональной связью при помощи флажковых замков. Установить другие две смежные рамы и также соединить их сдвоенными диагональными связями.

Внимание! Сдвоенные диагональные связи устанавливаются в крайнем левом и правом рядах в каждой ячейке, в остальных ячейках — в шахматном порядке.



III этап


Образованные ячейки строительных лесов укрепить горизонтальными связями при помощи флажковых замков и установить настилы на верхнюю перекладину рам\*.



\* Внимание! Укладывать настилы следует только на верхние перекладины рам!

IV этап

Установить рамы 2-го яруса на рамы 1-го яруса методом «труба в трубу», аналогично первому ярусу. Соединить их горизонтальными и сдвоенными диагональными связями.

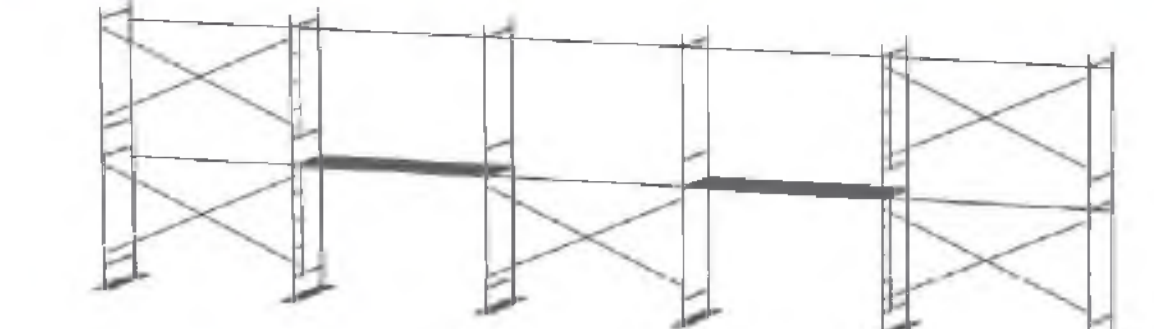

Одновременно монтажом произвести крепление к стене при помощи регулируемого кронштейна и анкерного болта (16). См. схему крепления к стене.

Количество точек крепления лесов должно быть не менее 1 анкер на 25 м<sup>2</sup> площади лесов. В крайних рядах крепятся все рамы.

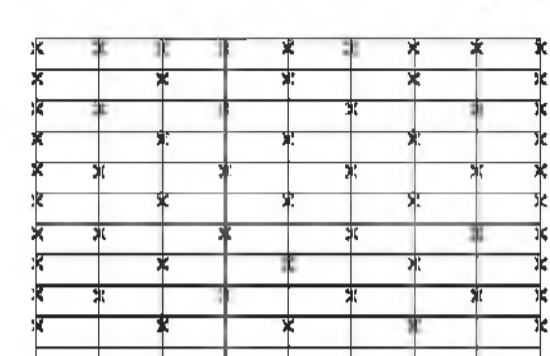


Схема крепления к стене

V этап

Повторяя этапы III, IV набрать необходимую высоту лесов. На рабочем ярусе при помощи флажковых замков для обеспечения безопасности установить рамы ограждения (8) или горизонтальные связи (5), выполняющие функцию ограждения. В местах подъема рабочих на рабочий ярус, установить горизонтальные связи (5), которые служат ограждением зоны подъема.




Важно!!! Строго соблюдать перечисленные ниже требования!

Перед началом монтажа внимательно изучите инструкцию по эксплуатации лесов




При помощи винтовых опор добейтесь строго горизонтального положения первого яруса лесов

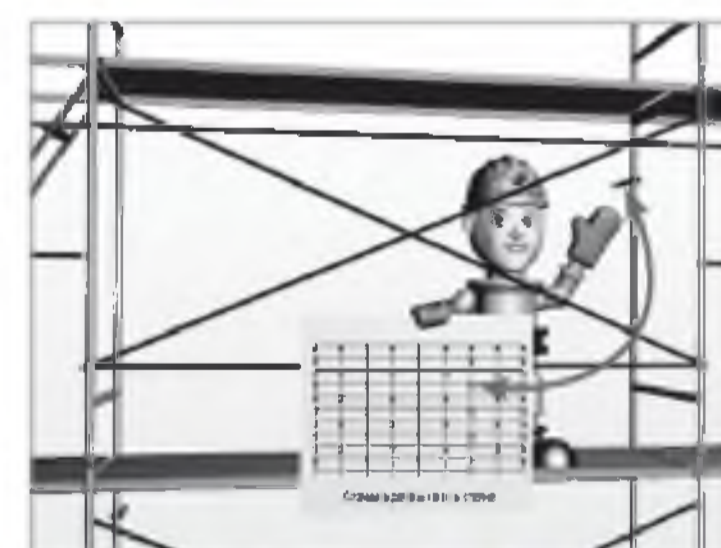

Фиксируйте леса к стене при помощи анкерных креплений в соответствии со схемой, приведенной в паспорте лесов

Соблюдайте строго вертикальное положение рам по всей высоте лесов

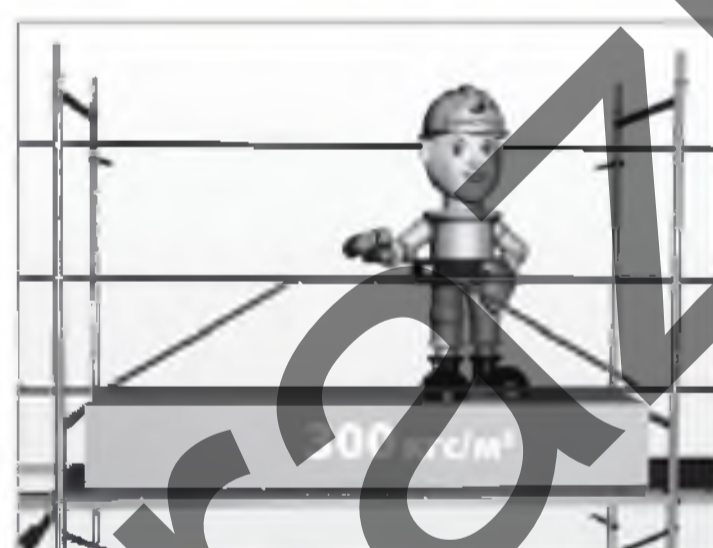

Не превышайте допустимые распределенные нагрузки на настил

Схема безопасности при работе с автовышкой

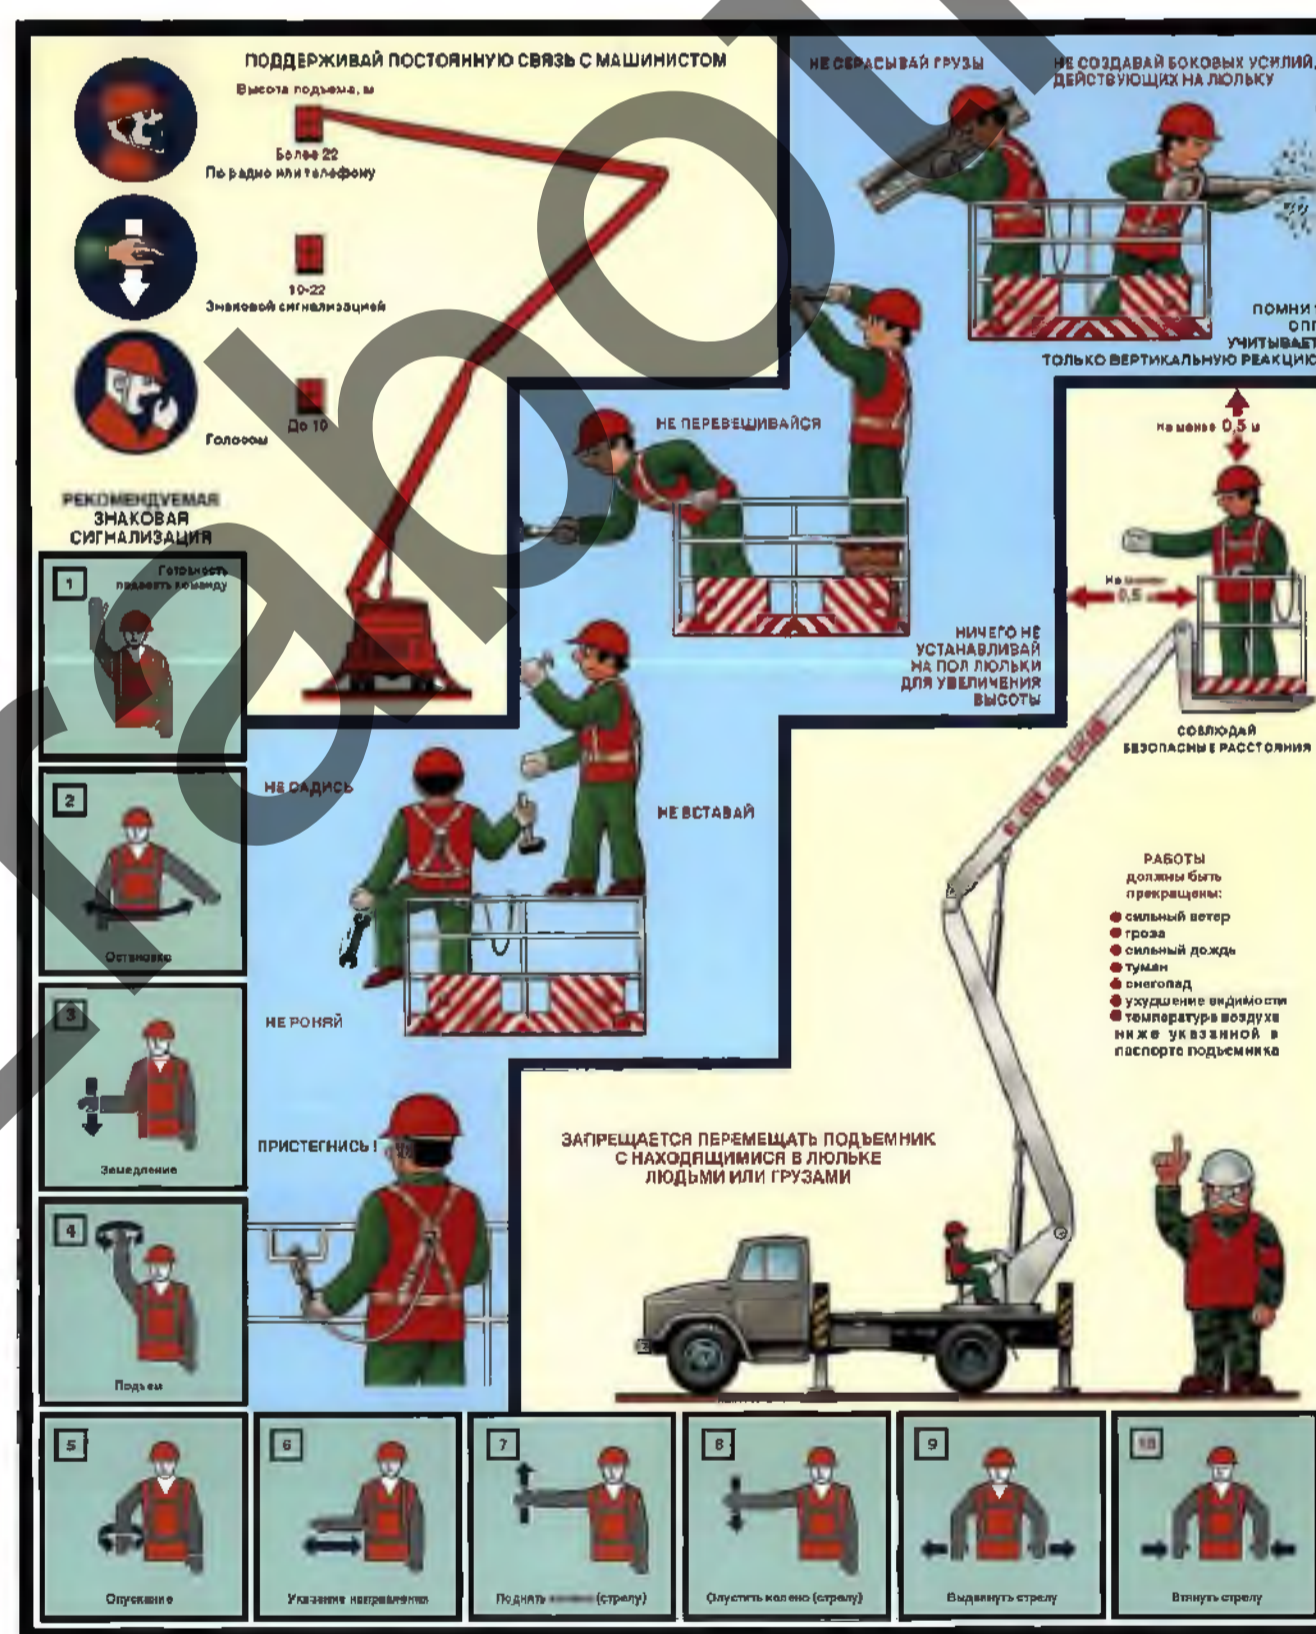


Схема безопасной работы стропальщиков в период разгрузки строительных материалов и работы краном

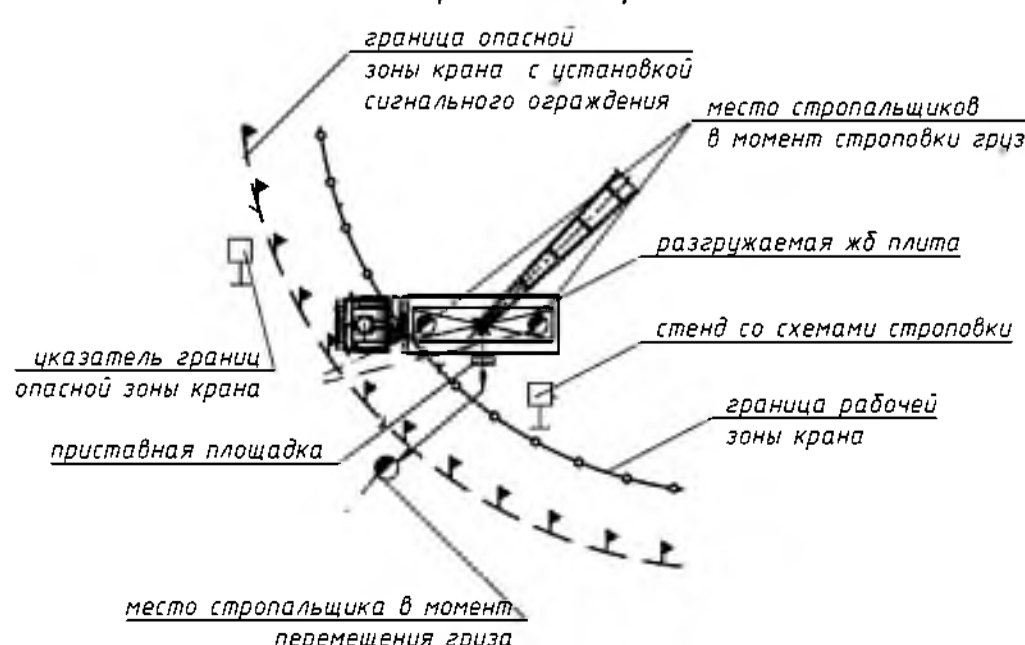


Схема безопасности при подъеме груза



Утверждаю.

Работа с лесом

- При производстве работ строго соблюдать требования ГОСТ 27321-2018, паспорта на строительные леса, технологические карты, действующих правил по охране труда Республики Беларусь, проектной документации, ГИР и действующих ТНПА.
- Перед транспортировкой элементы лесов должны быть транспортированы на высоте (расстояние от земли до нижних элементов) не менее 4 м от земли и со скрутки не менее 1,2 м. Высота, а также детали должны быть уложены в пакеты.
- Не допускается обрабатывать элементы лесов с присутствием пыли при разгрузке.
- При транспортировке и хранении пакеты и ящики с элементами лесов должны быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.
- Металлические строительные приспособления леса допускается эксплуатировать только после окончания их ремонта, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для проверки главным инженером строительной организации по технике безопасности.
- При приеме установленных лесов в эксплуатацию производится проверка соответствия маркировки маркировки элементов и правильности сборки узлов, правильности и надежности лесов на основании, правильности и надежности крепления лесов к стене, наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах, правильности установки поперечника и заземления лесов, обеспечение отвода воды от лесов, вертикальность стоек.
- Состояние лесов должно быть проверено перед началом работы производителем работ или мастером, руководителем работами.
- Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посылать лесом.
- Настилы на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных в паспорте.
- Плоты и детали лесов должны производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен: изучить конструкцию лесов, составить схему установки лесов для конкретного объекта, составить перечень необходимых элементов, произвести укладку элементов лесов со скрутки с вертикальной лобовыми элементами.
- Рабочие, монтирующие леса, должны быть ознакомлены с конструкцией и преемственностью о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.
- Леса должны монтироваться на специально подготовленной площадке, с которой должен быть обеспечен отвод воды.
- Полы и ступи элементной лесов должны производиться подметниками или другими подъемными механизмами.
- Монтаж лесов производится в соответствии со всеми требованиями паспорта лесов.
- Монтаж лесов производится согласно схеме, установленной с соблюдением порядка монтажа.
- Установка рам и закрепление лесов к стене производится одновременно.
- Детали лесов должны быть только из натурального остатков материалов, инвентаря и инструментов.
- Детали лесов должны быть маркированы с указанием яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа.
- Детали лесов должны быть маркированы перед перевозкой, маркировка должна быть нанесена в пакеты.
- До начала производства работ следует ознакомиться с инструкцией по охране труда при работе на высоте. Постановление Министерства труда Республики Беларусь Об утверждении Правил охраны труда при работе на высоте (с изменениями на последующие годы).
- Безопасность производства работ следует обеспечивать с соблюдением требований Постановления Министерства труда и социального защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 12/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ».
- Крепление элементов лесов к стене производится с помощью анкеров.
- Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте (минимум 1 крепление на 25 м). Произвольное крепление лесов к стене не допускается.
- Настилы лесов должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте (минимум 1 крепление на 25 м). Произвольное крепление лесов к стене не допускается.
- Важно! Подъем лесов на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.
- На лесах должны быть вывешены плакаты с инструкциями по технике безопасности, предупреждающие о возможных опасностях и мерах безопасности.
- Важно! Укладка настилов следует только на верхние перекладины рам!
- Важно! Во время проведения работ «ляжи» в местах подъема должны быть закрыты.
- Важно! При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых эми работами, запрещен.


Порядок безопасной работы с автомобильным краном

- До начала производства работ краном необходимо чтобы были соблюдены следующие условия:
  - Машинист и стропальщик должны пройти инструктаж по безопасности труда
  - Площадка, предназначенная для производства грузочем-разгрузочных работ должна быть освобождена от посторонних предметов, спланирована, подготовлена с учетом категории и характера грунта и иметь достаточную твердость, обеспечивающую устойчивость автомобильного крана, складывающих механизмов и транспортных средств.
  - Места производства грузочем-разгрузочных работ должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение.
  - Для предупреждения и возможной опасности в местах производства грузочем-разгрузочных работ должны быть установлены (вывешены) знаки безопасности.
- В процессе выполнения работ краном необходимо строго соблюдать следующие требования:
  - Установка автомобильного крана должна производиться на спланированной и подготовленной площадке. Устанавливать кран для работы на свежем воздухе на неутраченном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, запрещается.
  - Устанавливать автомобильный кран необходимо так, чтобы при работе расстояние между опорной частью крана при любых его поворотах и сторонами, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м.
  - Машинист обязан устанавливать кран на дополнительные опоры во всех случаях, когда такая установка требуется по характеристике крана, при этом он должен следить, чтобы опоры были исправны и под них были подложены прочные устойчивые подкладки.
  - После установки крана машинист обязан убедиться в достаточной освещенности рабочего места, зафиксировать стабилизатор для снятия нагрузки с ресор, заземлить кран с электрическим приводом, установить парковочный тормоз, установить сигналы между машинистом и стропальщиком.
- При подъеме, перемещении и опускании груза следует соблюдать требования безопасности:
  - на месте производства работ по перемещению грузов крана, а также на кране не допускать нахождения лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;
  - лиц и транспортные средства должны находиться на безопасном расстоянии от крана;
  - во время подготовки грузов к подъему следить за креплением и не допускать подъема плохо закрепленных грузов;
  - следить за работой стропальщиков и не включать механизмы автокрана без сигнала;
  - принимать сигналы к работе только от одного стропальщика-сигнальщика;
  - аварийный сигнал «стоп» принимать от любого лица, подающего его;
  - определять по указателю грузоподъемности грузоподъемности крана для каждого вылета стрелы;
  - первый подъем груза предупредить стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны подвешенного груза и возможного опускания стрелы;
  - не производить перемещение груза при нахождении под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;
  - устанавливать кран подъема механизма над грузом так, чтобы при подъеме груза исключалось косое натяжение грузовых канатов;
  - при подъеме груза предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности стропки и надежности действия тормоза;
  - перемещение груза нежелательной массы производить только после определения его фактической массы;
  - груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении предварительно поднять на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
  - при перемещении крана с грузом положение стрелы и нагрузку на кран устанавливать в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана;
  - опускание перемещаемого груза лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующие прокладки подкаты для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в мешках, для этого не предназначенных, не разрешается.
  - укладку и разгрузку груза производить равномерно, без нарушения установленных для складирования грузов параметров и без загромождения площадок;
  - пару грузу в автомобиль и другие транспортные средства производить таким образом, чтобы была обеспечена возможность удобной и безопасной стропки его при разгрузке;
  - при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций отключать рубильник вводного устройства;
  - при перебегах в работе груз не оставлять в подвешенном состоянии.
- При работе краном категорически запрещается:
  - допускать нахождение людей возле работающего крана во избежание захвата их между опорной и неподвижной частями крана;
  - допускать к объекту груза случайных людей, не имеющих удостоверения стропальщика;
  - применять неисправные или несоблюдательные грузозахватные приспособления, а также при отсутствии на них клейма или бирки;
  - поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы или масса его неизвестна;
  - опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет меньше массы подвешенного груза;
  - производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом стремительно опускать (сбрасывать) груз на площадку;
  - перемещать груз, находящийся в неустойчивом положении;
  - отрывать краном груз, зацепленный землей или прикреплённый к земле, заземленным другим грузами, укрепленным балками или залитым бетоном;
  - освобождать краном зацепленные грузом светящиеся грузозахватные приспособления (стропы, ящики и т.п.);
  - поднимать груз с поврежденными стропальными устройствами;
  - поднимать груз по земле, полу или рельсам краном при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;
  - оттягивать груз во время его подъема, перемещения и опускания. Для разгрузки длинномерных и круглоарочных грузов во время их перемещения, должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;
  - опускать груз на автомобиль, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомобиля;
  - работать при выведении из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;
  - укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на край откоса или траншеи;
  - поднимать или перемещать людей на кране, грузе или в кабинах поднимателей автомобильных механизмов.

92/23-ППР

Гарантия чистоты и безопасности				Гарантия чистоты и безопасности			
Изм.	Кол. чл.	Лист № док.	Подп.	Дата	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
Разработал	Каменицкий				Стадия	Лист	
Проверил					С	3	
ООО «Строительное управление №202»						Листов	5
Схемы безопасности							


Схемы строповки

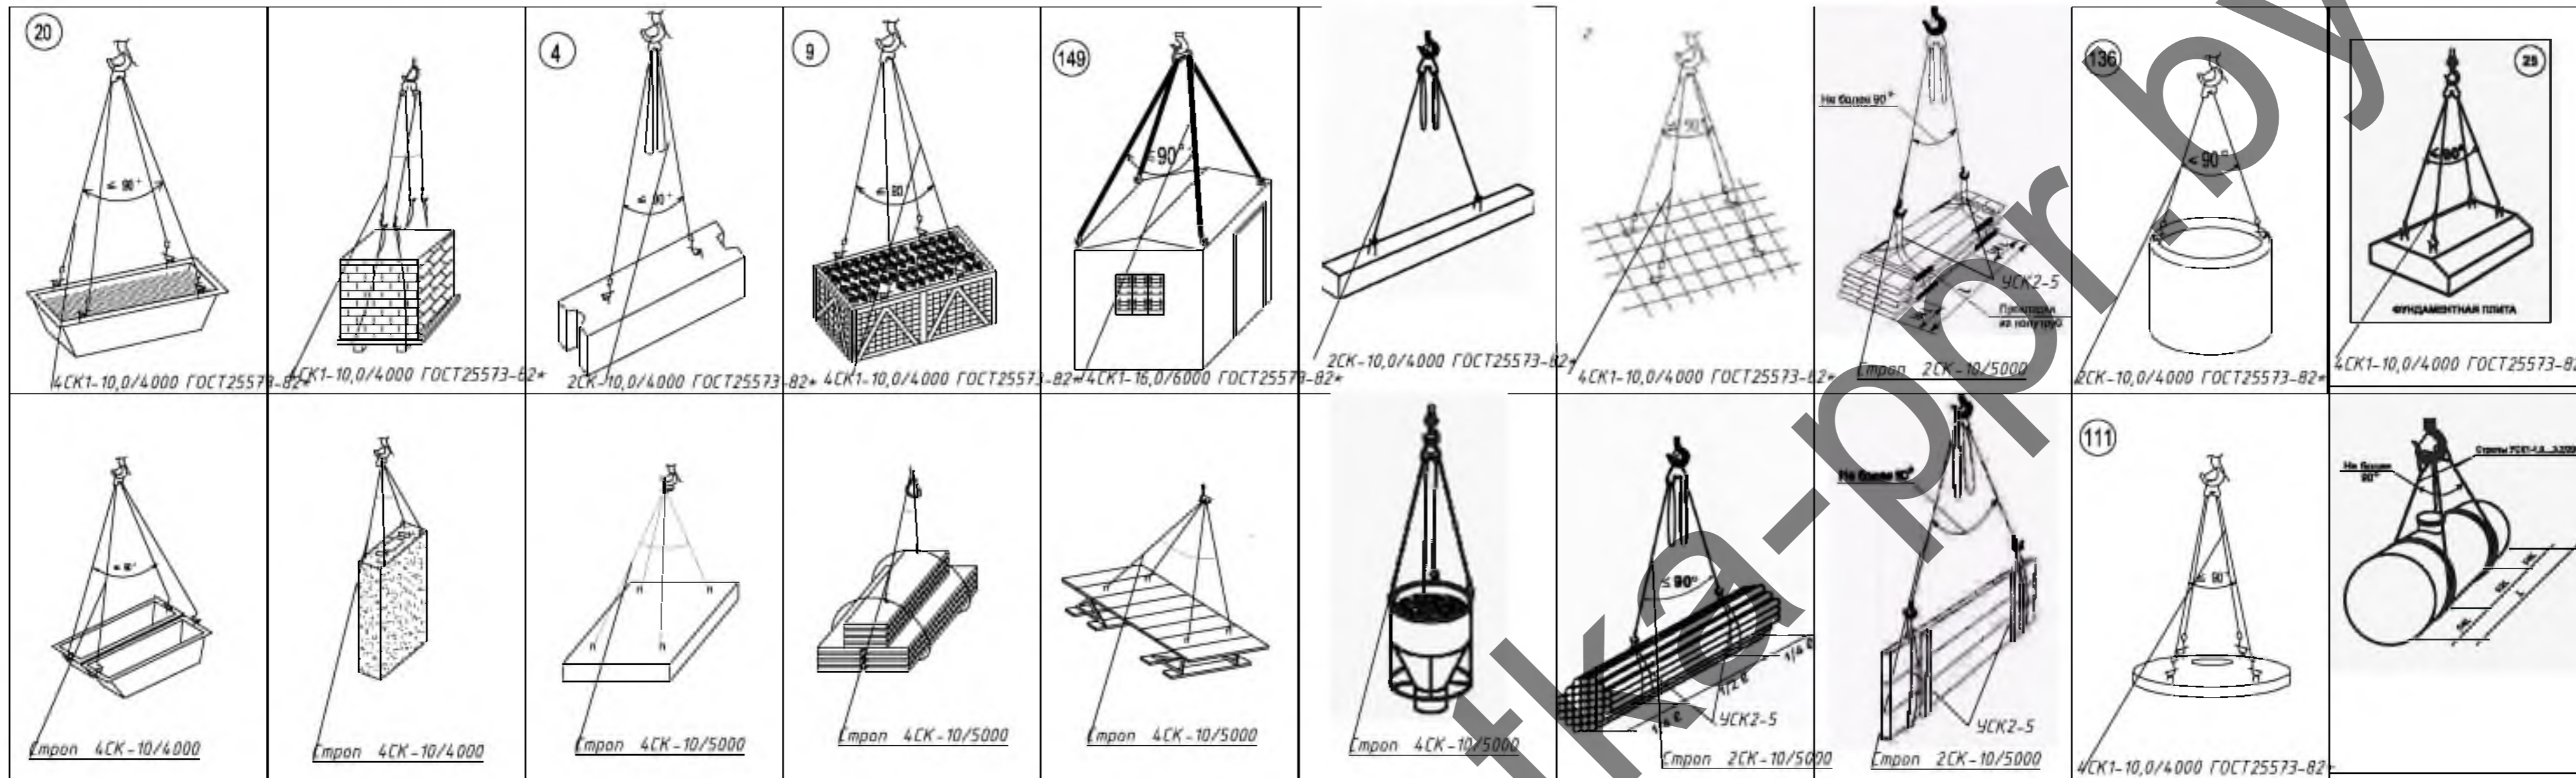

Примечание:


1. Строго соблюдать требования инструкции по охране труда для стропальщиков, Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
2. Стропы, за исключением строп на текстильной основе, должны быть снабжены паспортом согласно действующих ТНПА.
3. В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки: траверсы, клещи, другие захваты и тара – каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней; редко используемые съемные грузозахватные приспособления – перед их применением.
4. Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) грузоподъемных кранов или вывешены в местах производства работ.
5. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Перемещение груза с нарушением схемы строповки не допускается.
6. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
7. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
8. Стропальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное производство работ.
9. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен выполнять требования, изложенные в технологических картах, технологических регламентах.
10. Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.
11. Стропальщику не допускается привлекать к строповке грузов посторонних лиц.
12. Стропальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.
13. Складирование строительных материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта и выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.
14. Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, оседания и раскатывания складированных материалов.
15. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование строительных материалов на насыпных неуплотненных грунтах.
16. Между штабелями строительных материалов на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от забартоф транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
17. Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

Схемы складирования

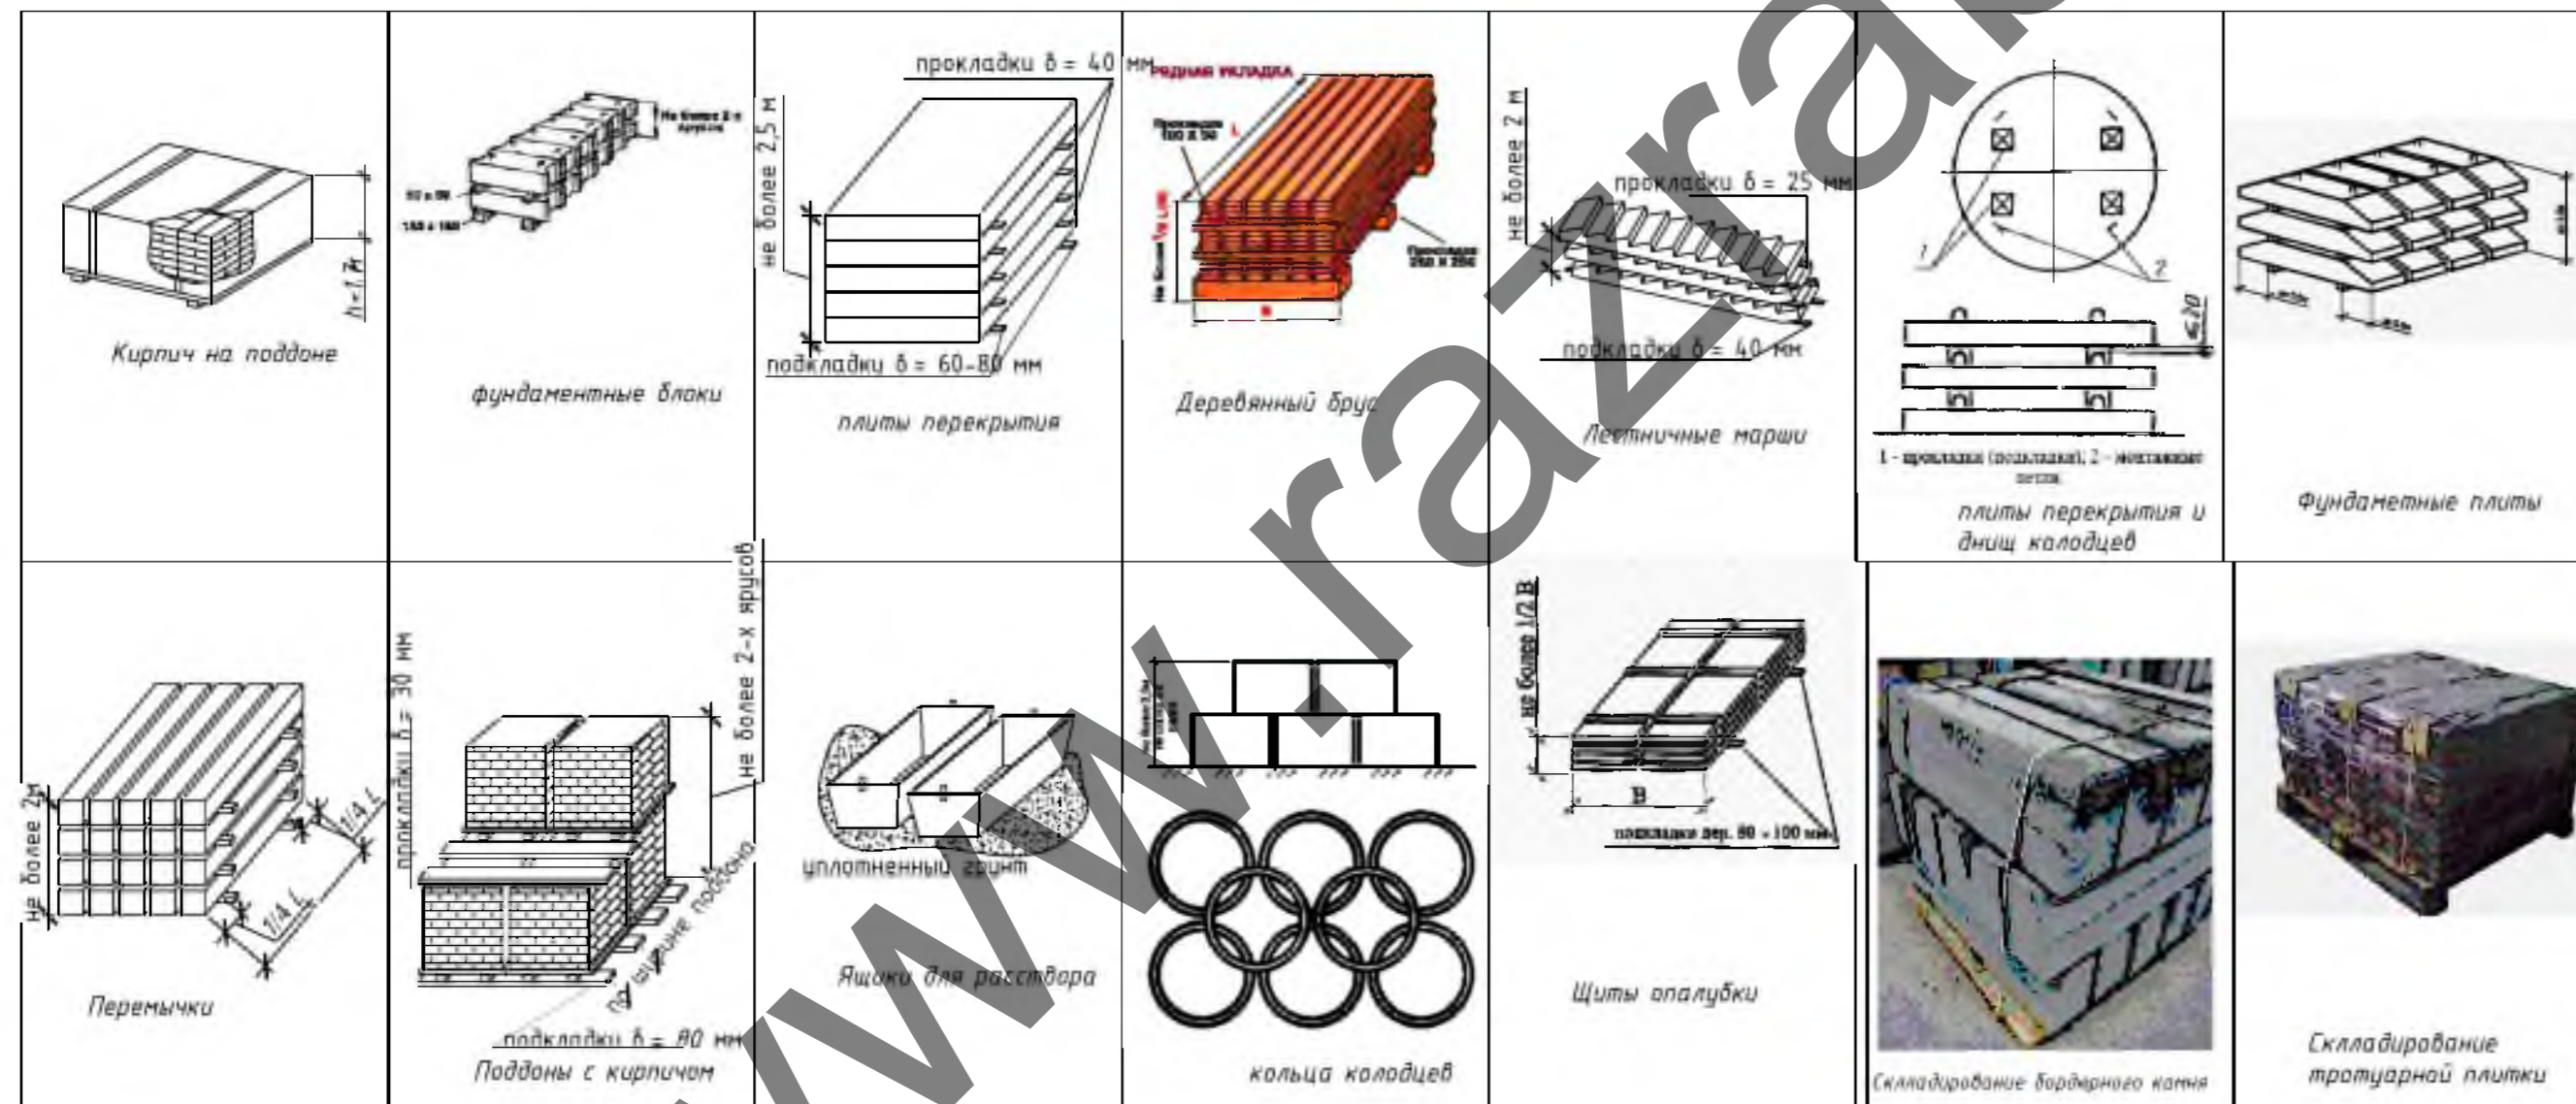

					92/23-ППР			
					Строительство четырехквартирного жилого дома в аг. Кемелишки Островецкого района			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Каменецкий					ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
						С	4	5
						Схемы строповки и складирования		
						ООО «Строительное управление №202»		


Схема мест крепления страховочных приспособлений при кровельных работах

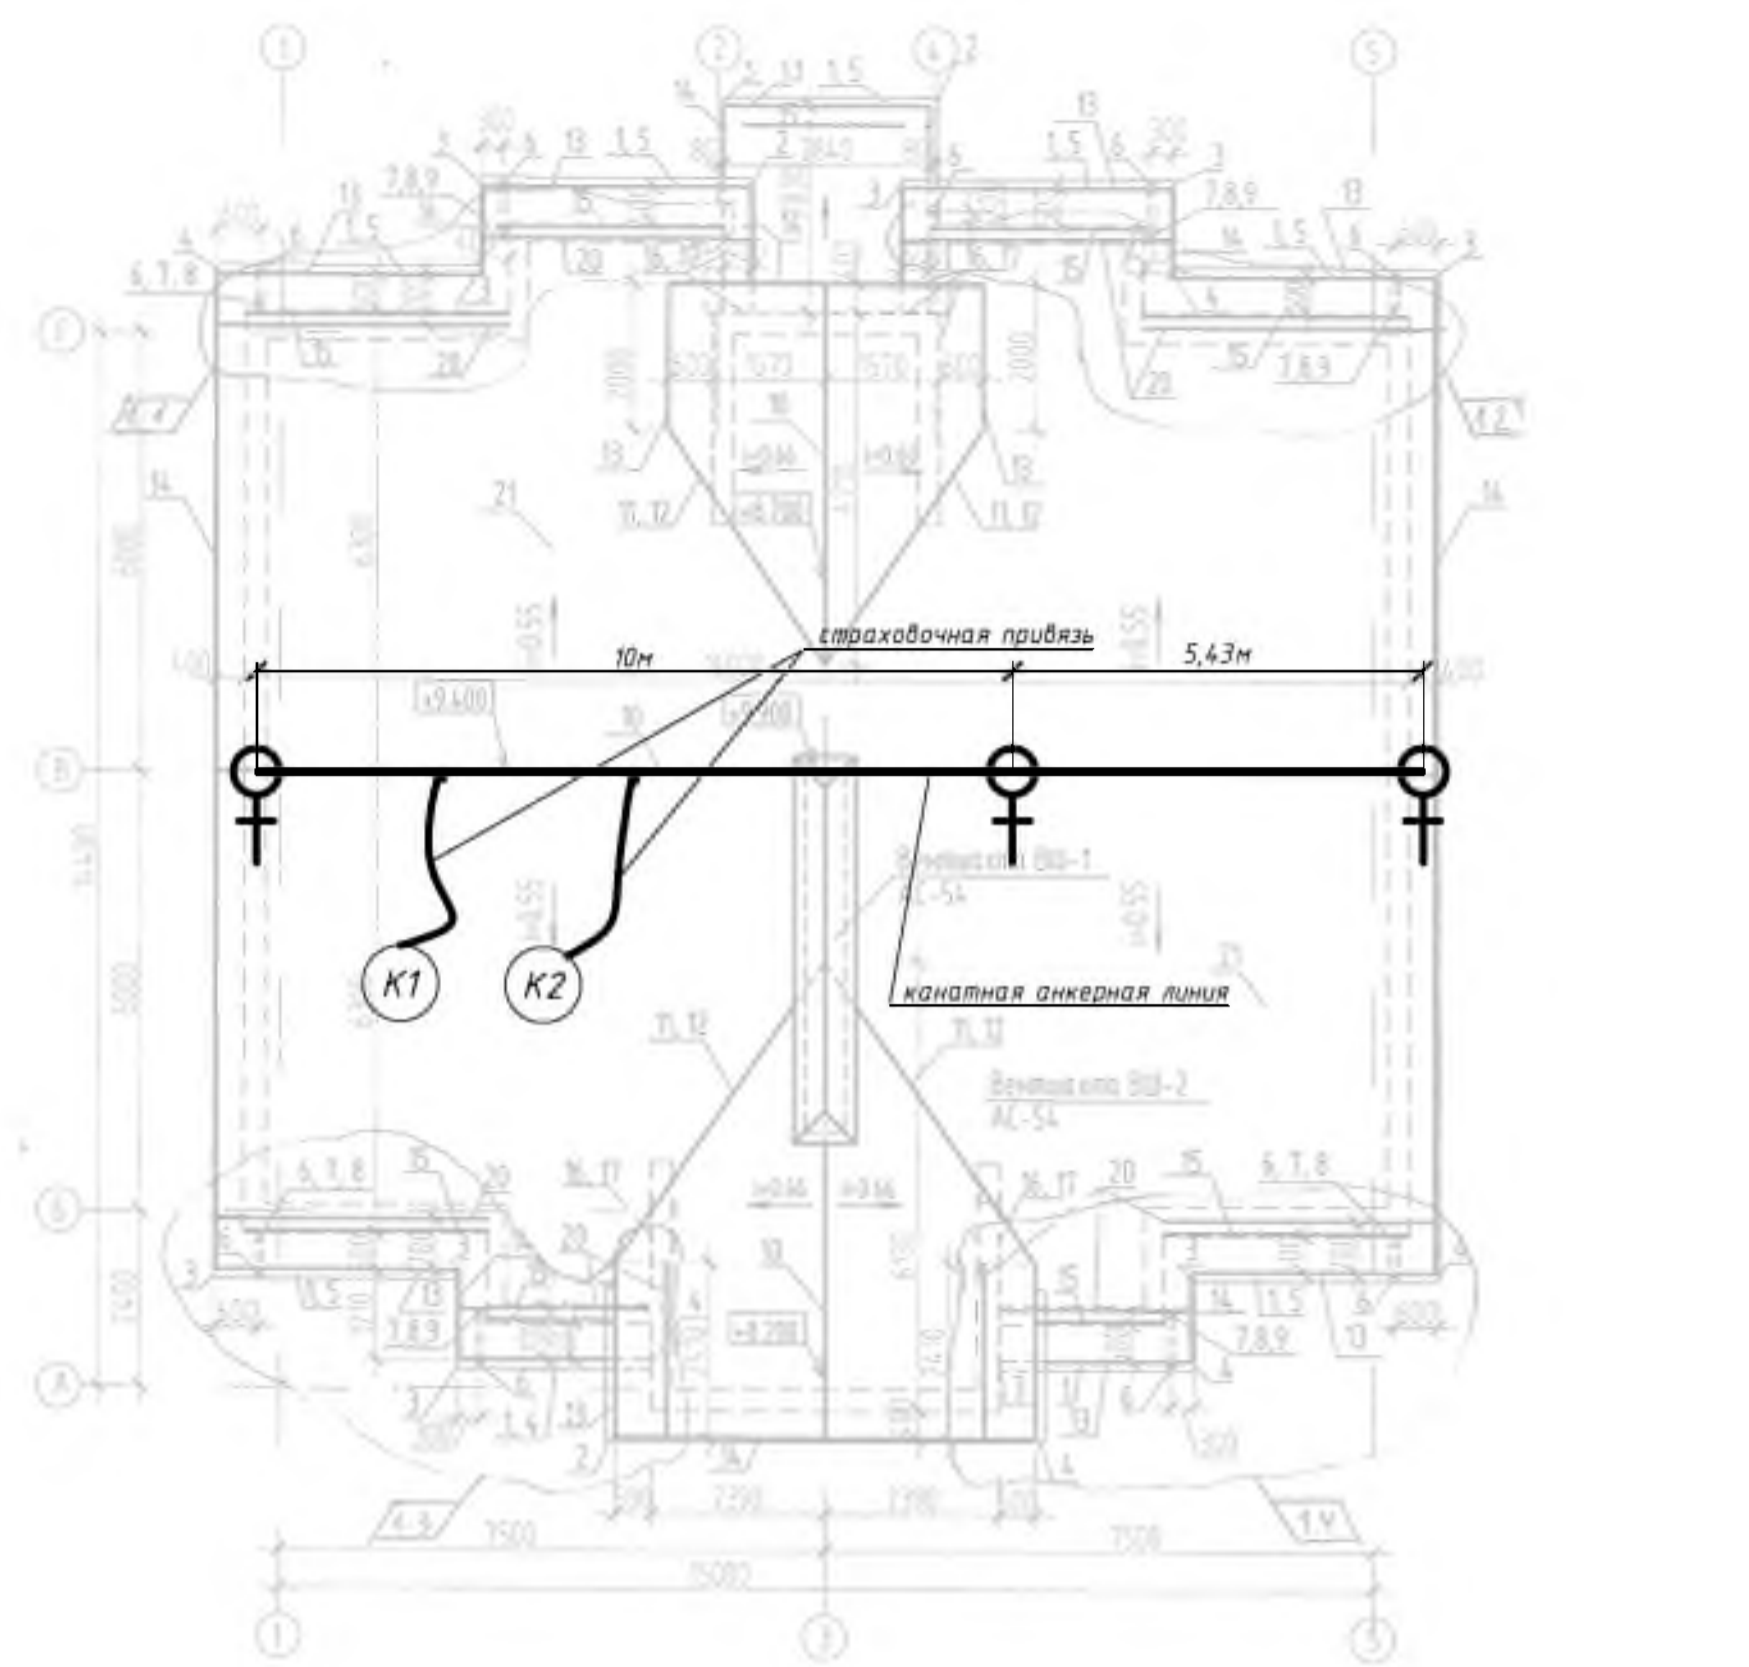

Условные обозначения

- страховочный трос
- места крепления страховочного троса
- кровельщик

Схема мест крепления страховочных приспособлений при работе на перекрытии

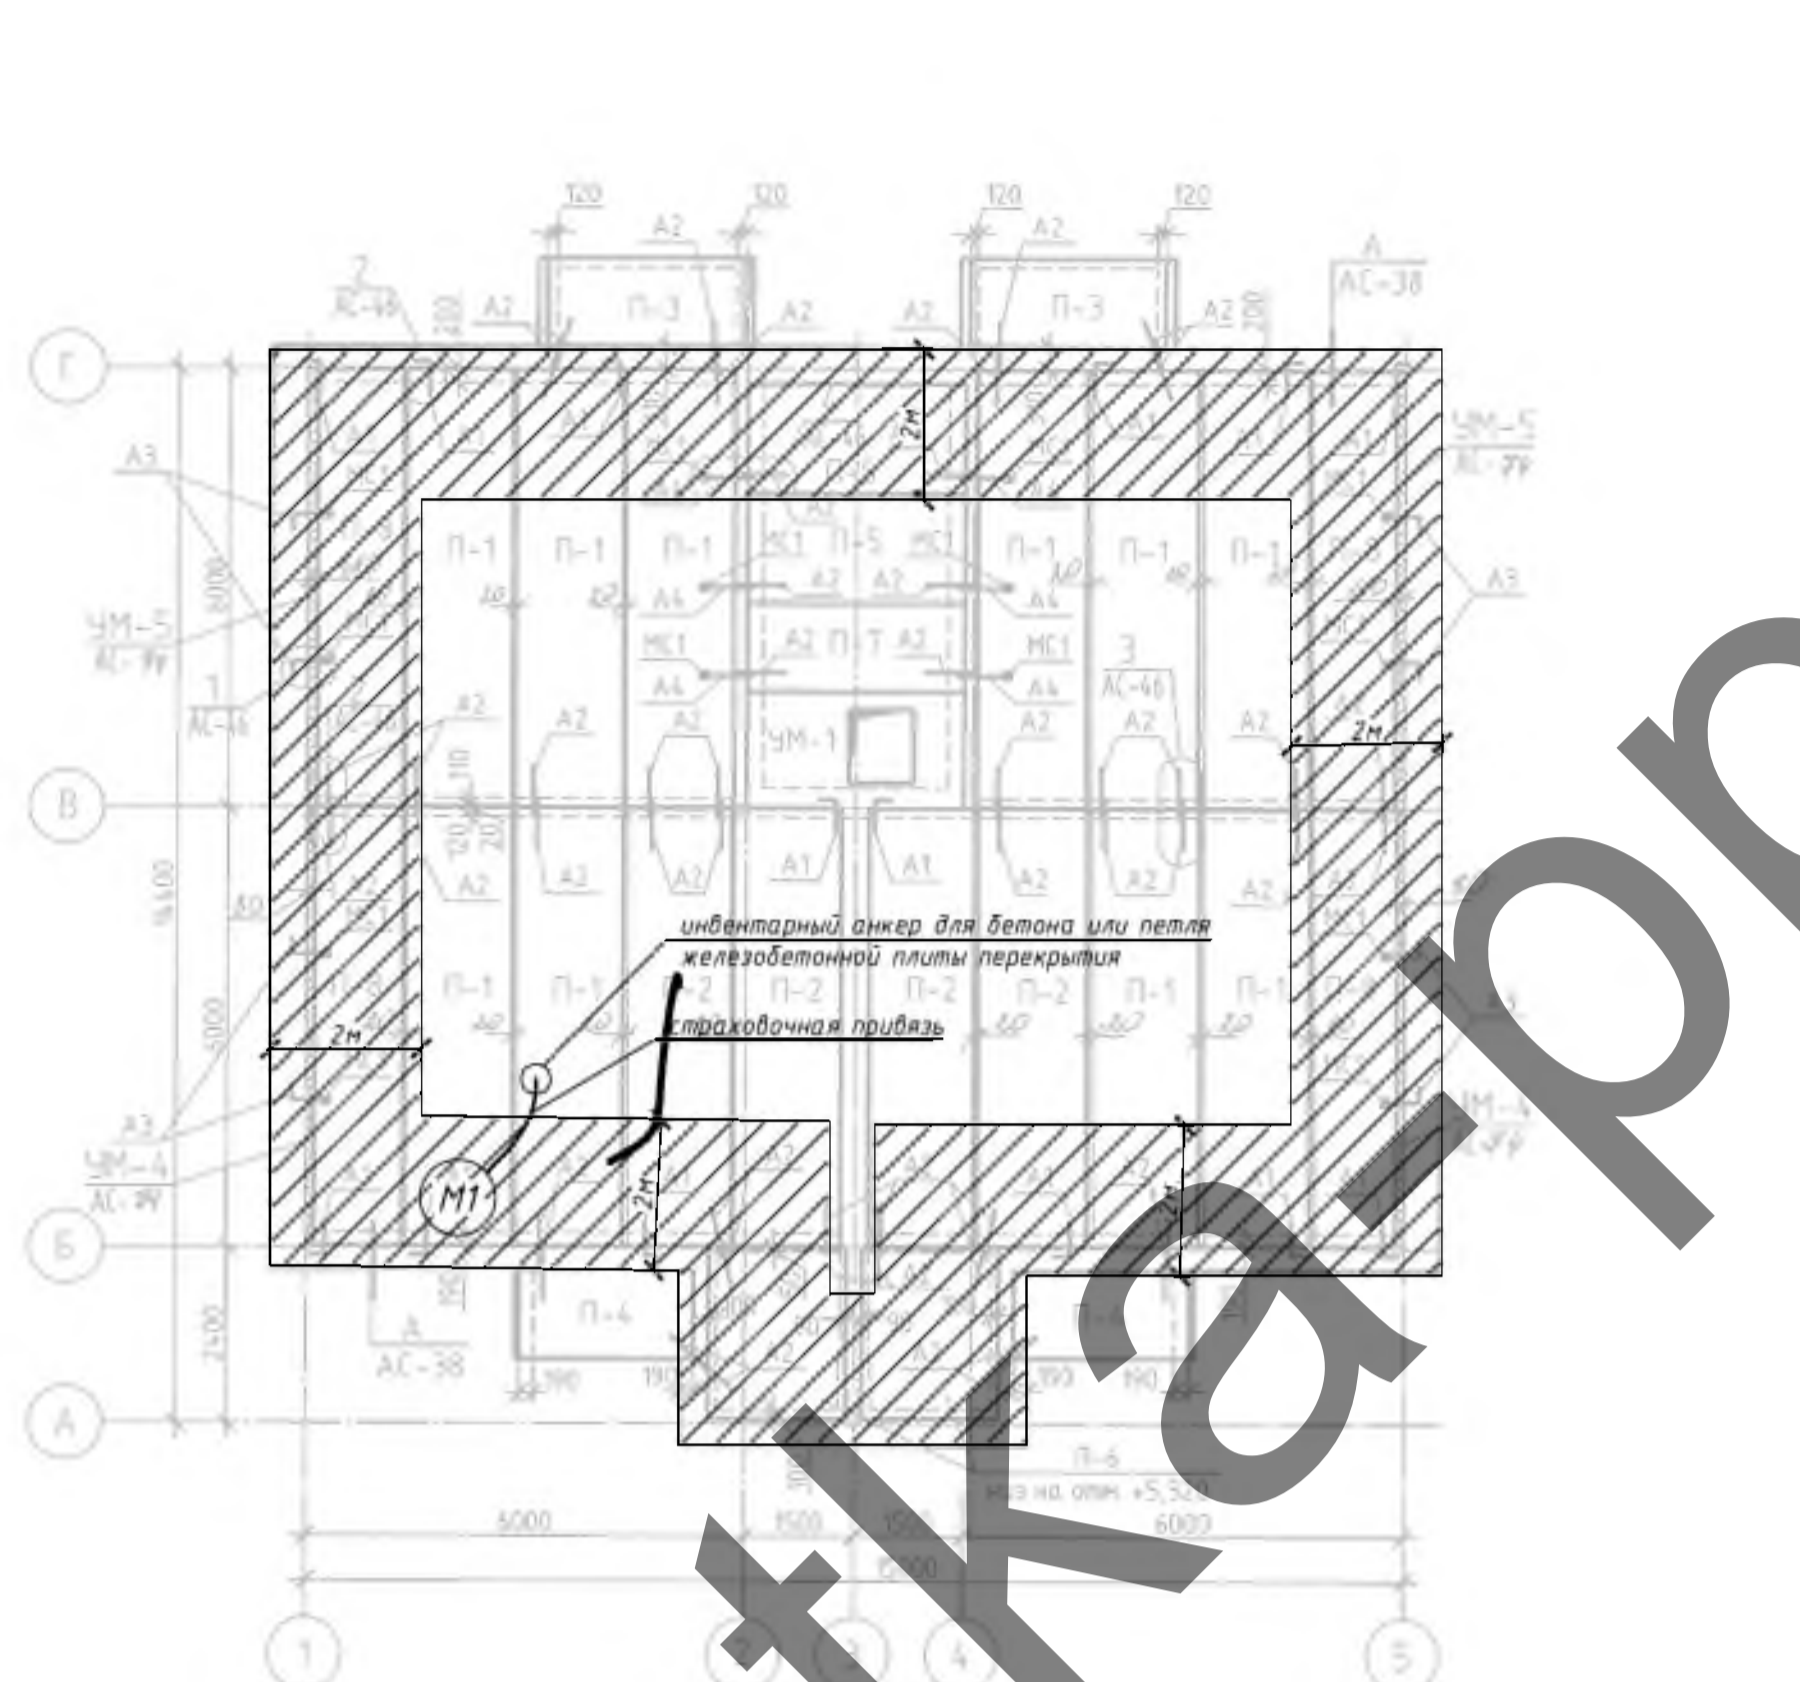

- каменщик/монтажник
- зона обязательной страховочной привязи при каменных работах (2м от перепада высот)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ТОЧКИ ПРИВЯЗИ ИНВЕНТАРНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ БЕТОНА ИЛИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЕТЛИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ


Общий вид крепления страховочных анкеров к стропилам



Варианты страховочных схем при работе на скатной кровле



Пример использования страховочной системы

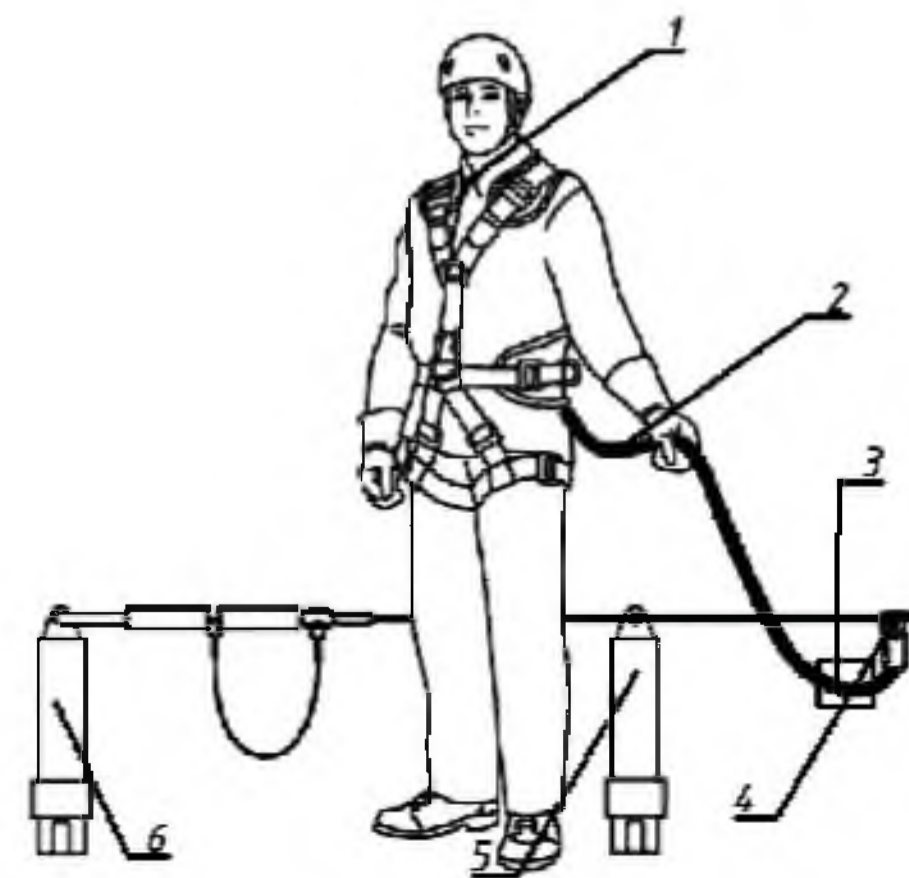

Монтаж системы производить согласно инструкции изготовителя

Примечание

1. Кровельные работы следует выполнять в соответствии с проектной документацией, требованиями действующих строительных норм, данного ППР, разработанных в соответствии с СН 1.03.04-2020, технологическими картами на выполнение отдельных видов работ.
2. Допуск работающих на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра несущих конструкций крыши и ограждений линейным руководителем работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.
3. Подниматься на крышу и спускаться с нее следует только по внутренним лестничным клеткам. Запрещается использовать в этих целях пожарные лестницы.
4. Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанном на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.
5. При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять предохранительные пояса.
6. Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны.
7. Запас материалов на крыше не должен превышать сменной потребности.
8. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны с крыши.
9. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.
10. Строительные материалы, применяемые для кровельных работ, должны соответствовать требованиям ТНПА, иметь документы изготовителей, подтверждающие их качество, и, в соответствии с действующим законодательством, документы подтверждения соответствия.
11. Транспортирование, складирование и хранение материалов на строительной площадке следует осуществлять в соответствии с требованиями ТНПА, с учетом рекомендаций изготовителя.
12. Контроль качества и приемка кровельных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА.
13. Запрещается складирование тяжелых предметов по уложенному покрытию.
14. Выполнение кровельных работ во время дождя, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, не допускается.
15. Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 и составлять не менее 30 лк.
16. Для предупреждения опасности падения работающих с высоты в мероприятиях по наряду-допуску должны предусматриваться места и способы крепления страховочных и несущих канатов, страховочной и удерживающей привязей, пути и средства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам производства работ, обеспечение освещения рабочих мест, проходов к ним, средства (способы) сигнализации и связи; мероприятия по предупреждению опасности падения с высоты конструкций, изделий, предметов, материалов.
17. Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных устройств между ними не допускаются.
18. При проведении работ на высоте с применением грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары должны соблюдаться требования Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
19. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и на открытых местах должны быть прекращены при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, а также других условиях, исключающих видимость в пределах фронта работ. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью и в иных случаях, предусмотренных в настоящих Правилах, работы прекращаются при скорости ветра 10 м/с и более.
20. В зависимости от конкретных условий работ на высоте работающие должны быть обеспечены следующими СИЗ.
21. Соединительные элементы в системах индивидуальной защиты от падения с высоты (далее - соединительные элементы) должны обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой, в том числе при надетой на руку утепленной перчатке.
22. Соединительные элементы не должны иметь острых кромок или заусенцев, которые могут поранить работающего или прорезать, истирать или как-либо иначе повредить ткань строп или канат (веревку).
23. Мероприятия по работе в зимних условиях следующие: участки кровли, на которых ведутся работы, надо очистить от снега и наледи; открытые участки закрывать от атмосферных осадков гидроизоляционным материалом; материалы в зимнее время складировать на очищенных от снега и льда площадках; работники должны иметь зимнюю спецодежду, противоскользкую обувь, теплые перчатки; спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком; проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок, участков работ должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и строительными конструкциями; очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема; для работающих на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже +5 °С должны быть предусмотрены помещения для обогрева. В проекте принято использование существующих помещений согласно данным заказчика. Также в этих помещениях производится сушка одежды; при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в холодное время года устанавливаются перерывы для обогрева работающих или работы прекращаются в зависимости от температуры воздуха и силы ветра согласно действующему законодательству.

Важно! При монтаже перекрытия и каменных работ в качестве анкеров крепления использовать сухие петли на плитах перекрытия, а также анкера, выполненные на старых жб плитах. Точки крепления определять мастер/прораб в зависимости от ситуации. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями. (Высота ограждения не менее 1,2м)

			92/23-ППР		
			Строительство четырехквартирного жилого дома в аг. Кемельши Островского района		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Кемельшич				
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ			Стадия	Лист	Листов
Схемы крепления страховки при кровельных работах, каменных работах, монтаже перекрытия			С	5	5
			ООО «Строительное управление №20»		
			Формат А1		
